PAEB
PROJET D'APPUI À L'ENTREPRENEURIAT AU BÉNIN

ADPME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Janvier 2026

RAPPORT ANNUEL 2025



Unité de Gestion du Projet

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

CDC
Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin

En partenariat avec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFD
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE FRANCE
GROUPE AFD

Table des Matières

Résumé Exécutif 03

Introduction 04

I. Brève rétrospective de la planification 2025 04

II. Niveau d'exécution consolidée des composantes métiers 2 et 3 05

III. Niveau d'exécution consolidée de la composante 1 07

IV. Point d'exécution des aspects transversaux 08

V. Niveau d'atteinte des indicateurs du cadre logique 11

VI. Activités spécifiques mises en œuvre en marge du PTAB 2025 15

VII. Situation financière et exécution budgétaire (PTBA 2025) 16

Conclusion 20

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'année 2025 a constitué une année de structuration dans la mise en œuvre du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB), marquée à la fois par la réorganisation progressive du dispositif opérationnel et par des contraintes structurelles ayant affecté le rythme global d'exécution. Après un démarrage opérationnel effectif en 2024, le projet est entré en 2025 dans une phase de montée en charge, avec des avancées notables sur plusieurs chantiers structurants, en dépit de niveaux d'exécution inférieurs aux planifications initiales.

Sur le plan stratégique, la planification 2025 s'est articulée autour de quatre composantes complémentaires. La Composante 1, dédiée au renforcement des capacités de l'écosystème institutionnel en faveur de l'entrepreneuriat, a principalement porté sur la mise en place des prérequis opérationnels, notamment à travers l'avancement du développement de la plateforme e-PME et le lancement du processus de recrutement d'un cabinet chargé du renforcement des capacités des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE). Les actions de déploiement territorial ont été amorcées à l'occasion du Mois de l'Entrepreneuriat, posant les bases du modèle d'intervention territorialisée qui sera pleinement opérationnalisé en 2026.

Les Composantes 2 et 3, cœur opérationnel du projet et représentant près de 77 % de la planification budgétaire de 2025, ont permis l'accompagnement de PME en phase d'amorçage, de croissance et à fort potentiel, via des appuis non financiers et financiers. Au 31 décembre 2025, les niveaux de réalisation demeurent en deçà des cibles cumulées, tant sur les appuis non financiers que financiers. Cette situation s'explique principalement par l'arrêt des comités de sélection à partir de juillet 2025, ainsi que par la réorganisation opérationnelle de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) au dernier trimestre. Des chantiers structurants ont toutefois été engagés en fin d'année afin de créer les conditions d'une accélération de l'exécution en 2026.

L'analyse transversale met en évidence des déséquilibres structurels que le projet entend corriger à partir de 2026. Sur le plan territorial, environ 67 % des PME accompagnées sont concentrées dans les départements de l'Atlantique et du Littoral, tandis que les départements du Nord demeurent sous-représentés. Ces constats ont conduit à réorienter les priorités stratégiques du PAEB vers un déploiement territorial renforcé, un meilleur ciblage géographique et une intégration plus affirmée des enjeux de genre dans les dispositifs d'accompagnement à venir.

Sur le plan financier, au 31 décembre 2025, le PAEB a reçu des avances initiales cumulées de 7,82 M€, pour des décaissements cumulés de 4,97 M€, soit un taux global d'exécution de 63,6 %. L'exécution financière est principalement portée par le prêt AFD, quasi entièrement consommé, tandis que les subventions AFD et UE présentent des taux d'absorption plus faibles, laissant une marge financière significative pour la poursuite et l'accélération des activités en 2026.

Enfin, le volet communication a contribué à renforcer la visibilité du PAEB et de l'écosystème entrepreneurial béninois, notamment à travers l'organisation des PME Connect et la participation aux Rencontres Africa 2025.

En perspective, l'année 2026 devra permettre de capitaliser sur les bases posées en 2025, d'accélérer l'exécution opérationnelle et financière, et de renforcer l'impact du PAEB à travers un déploiement territorial effectif, une meilleure inclusion des femmes entrepreneures et une absorption accrue des ressources disponibles, en alignement avec les objectifs stratégiques du projet.

INTRODUCTION

Le défi d'une croissance rapide et soutenue dans les années à venir nécessite un secteur privé dynamique et prospère, véritable levier de développement. Dans ce contexte, le renforcement et le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent une condition essentielle pour stimuler et pérenniser cette croissance. Conscient de cet enjeu, le Gouvernement, avec l'appui technique et financier de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, a placé le développement des PME et la promotion de l'emploi au cœur de ses priorités. Ainsi, suite au Conseil des Ministres du 23 mars 2022, l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) a été créée en tant que guichet unique pour l'accompagnement des PME.

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB) constitue le bras opérationnel de l'ADPME, avec un coût global de 32,2 millions d'euros, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union Européenne.

Le présent Rapport d'Avancement 2025 s'inscrit dans le cadre du reporting annuel, conformément aux exigences du Prodoc du PAEB. Il présente successivement : la rétrospective de la planification 2025 ; l'exécution des composantes 2–3, puis de la composante 1 ; l'avancement des volets transversaux (ESG, suivi-évaluation, communication) ; le niveau d'atteinte du cadre logique ; les activités spécifiques mises en œuvre en marge du PTAB ; ainsi que la situation financière et l'exécution budgétaire du PTBA 2025, avant de conclure sur les perspectives.

I. Brève rétrospective de la planification 2025

L'année 2025 a marqué une étape déterminante dans la mise en œuvre du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB). La planification annuelle s'est inscrite dans une logique de déploiement opérationnel du dispositif, de renforcement de l'écosystème entrepreneurial et d'accompagnement ciblé des micros, petites et moyennes entreprises à différents stades de maturité. L'ensemble des actions programmées pour l'année a été soutenu par un budget global de 8 208 463 euros. Cette section présente les principales orientations et activités prévues ; les sections suivantes détaillent le niveau d'exécution et les réalisations effectives.

La planification 2025 a été structurée autour de quatre composantes complémentaires. La première composante visait la structuration du schéma opérationnel de déploiement territorial du PAEB. Elle prévoyait la réalisation d'une étude de diagnostic de l'écosystème des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE), l'élaboration de plans de renforcement de capacités adaptés, ainsi que le fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet et des dispositifs opérationnels associés.

La deuxième composante portait sur l'appui aux jeunes entreprises, avec un accompagnement intégré de cent cinquante (150) MPME. Cet appui devait combiner des interventions non financières, notamment l'accompagnement par les SAE, la mobilisation de prestataires externes, ainsi que des formations généralistes et spécifiques intégrant les dimensions Environnement & Social et Genre. Il devait également inclure un appui à l'obtention des Études d'Impact Environnemental et Social et des Certificats Environnementaux. En parallèle, des appuis financiers étaient programmés sous forme de subventions d'amorçage pour soixante-douze (72) MPME en phase d'amorçage et d'avances remboursables pour trente (30) MPME en phase de croissance au titre de l'année 2025.

La troisième composante ciblait quarante-cinq (45) entreprises à haut potentiel, bénéficiant d'un accompagnement non financier renforcé assuré par les SAE et des prestataires spécialisés. Cet accompagnement devait être complété par des formations généralistes et spécifiques, incluant les thématiques Environnement & Social et Genre, ainsi que par un appui à l'obtention des EIES et des Certificats Environnementaux. Un appui financier sous forme d'avances remboursables était également prévu au titre d l'année 2025 pour cinq (05) MPME à fort potentiel.

La quatrième composante était dédiée au déploiement du dispositif de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage du PAEB. Elle prévoyait la réalisation de l'étude de référence des indicateurs, la collecte des données de base, ainsi que les missions de suivi-évaluation terrain. Cette composante intégrait également la conduite des audits et de l'évaluation à mi-parcours du projet au titre des années 2023 et 2024, ainsi que la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité du PAEB, conformément au Plan de Communication et de Visibilité du projet.

II. Niveau d'exécution consolidée des composantes métiers 2 et 3

Les composantes métiers 2 et 3 constituent le cœur opérationnel du PAEB et concentrent 77 % de la planification 2025, traduisant la priorité accordée à l'appui direct aux entreprises. La composante 2 porte sur l'identification, la sélection et l'accompagnement des jeunes entreprises, en phase d'amorçage et de croissance, à travers des services financiers et non financiers. La composante 3 vise le renforcement de la compétitivité et la modernisation des entreprises existantes à fort potentiel, dans une logique d'émergence de champions nationaux.

Le bilan ci-après présente le niveau de réalisation consolidé de ces deux composantes.

Niveau d'exécution consolidée de la composante 2

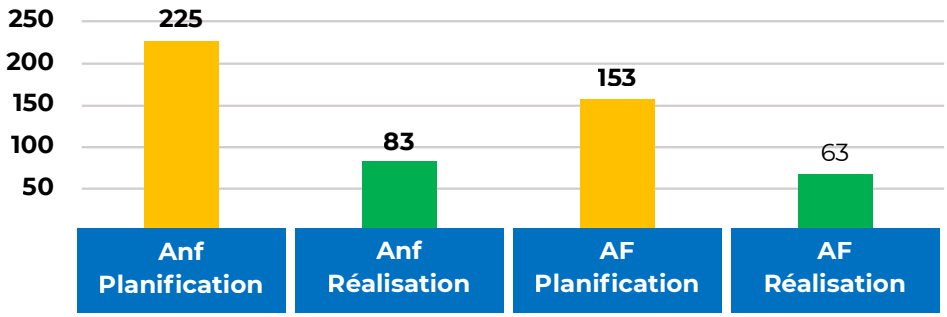


Figure 1 : Niveau d'exécution des appuis (techniques et financiers) pour les PME de la composante 2

Au 31 décembre 2025, le bilan de l'accompagnement des jeunes entreprises révèle des performances globales en deçà des objectifs cumulés sur la période 2023-2025. Le taux de réalisation atteint 37 % pour l'appui non financier, avec 83 interventions réalisées sur 225 prévues, et 38 % pour l'appui financier, avec 58 PME bénéficiaires sur 153 attendues. Dans le détail de l'appui non financier, les 83 interventions concernent 69 entreprises en phase d'amorçage (83 %), dont 63 ont également bénéficié d'un appui financier, et 14 entreprises en phase de croissance (17 %), dont 5 ont reçu un appui financier.

Niveau d'exécution consolidée de la composante 3

Nature	Planification	Réalisation	Planification	Réalisation
Type d'appui	Appui non Financier		Appui Financier	
Fort potentiel	72	40	24	8

Tableau 1: Niveau d'exécution des appuis (techniques et financiers) pour les PME de la composante 3

Le segment des entreprises à « Fort Potentiel » présente des résultats contrastés au 31 décembre 2025, avec un taux de réalisation de 55,6 % pour les appuis non financiers (40 entreprises accompagnées sur 72 prévues à fin 2025) et de 33,3 % pour les appuis financiers (8 entreprises accompagnées sur 24 prévues). Les perspectives 2026 viseront donc à accélérer la montée en charge du dispositif sur les deux volets, en consolidant l'accompagnement technique des entreprises à fort potentiel et en augmentant le taux de conversion vers l'appui financier, afin de converger vers les cibles fixées.

Appréciation globale de la mise en œuvre des composantes métiers :

Indicateur	Planification AnF Fin de Projet	Réalisation Anf au 31/12/25	Planification AF Fin de Projet	Réalisation AF au 31/12/25
Jeune Entreprise	425	83	255	63
Fort Potentiel	120	40	40	8

Tableau 2 : synthèse des réalisations des composante 2 et 3 par rapport aux objectifs global du projet

Les niveaux de réalisation des appuis financiers (AF) et non financiers (AnF) au 31 décembre 2025 demeurent inférieurs à la planification, tant pour les jeunes entreprises que pour les PME à fort potentiel. Cette situation s'explique par un ensemble de facteurs structurels et institutionnels ayant affecté le rythme d'exécution du projet.

En premier lieu, le projet a accusé un retard de démarrage opérationnel estimé à environ 18 mois, avec un lancement effectif seulement en 2024. Ce décalage initial n'a pas permis d'engager à temps les activités prévues pour les premières années, ni de rattraper les objectifs cumulés initialement projetés pour 2023 et 2024. Ce retard structurel a mécaniquement comprimé le calendrier de mise en œuvre et augmenté la pression sur les volumes d'appui à délivrer sur une période réduite.

À ce facteur s'est ajouté, en 2025, un ralentissement significatif du processus décisionnel, consécutif à l'arrêt des comités de sélection à partir de juillet 2025. Cette situation a limité l'approbation de nouveaux dossiers d'appui et réduit le flux d'engagement des bénéficiaires.

Par ailleurs, la réorganisation de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) durant le dernier trimestre 2025 a entraîné un ralentissement temporaire des circuits de validation, de contractualisation et de décaissement, impactant directement la capacité d'exécution opérationnelle.

PME soutenues par département

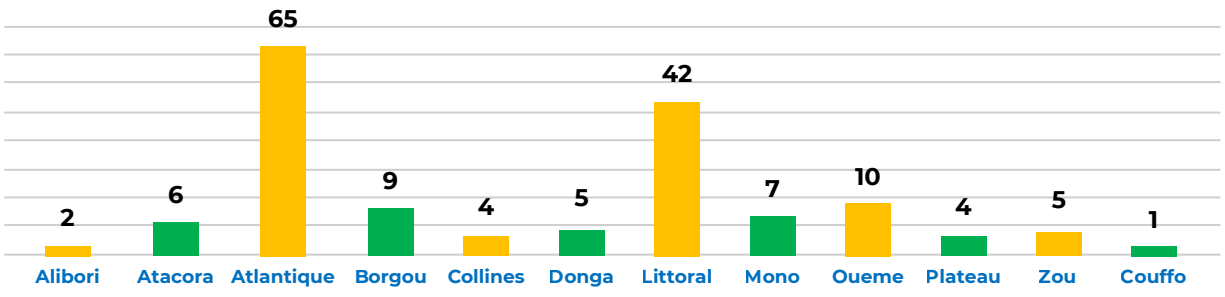


Figure 2 : répartition par département des PME soutenues par le PAEB

L'analyse de la répartition géographique des PME accompagnées met en évidence une forte concentration des appuis dans les départements de l'Atlantique et du Littoral, qui regroupent à eux seuls environ 67 % des bénéficiaires. Cette situation reflète l'orientation initiale du projet vers les pôles économiques les plus structurés et facilement accessibles.

À l'inverse, les départements du Nord (Alibori, Atacora, Borgou, et Donga) ne représentent que 13,75 % des PME appuyées, tandis que le Couffo demeure très faiblement couvert, avec une seule PME accompagnée. Cette situation souligne l'importance de soutenir davantage le développement des PME dans le Nord du Bénin, où le potentiel entrepreneurial est réel mais encore peu exploité.

Cette configuration met en évidence un enjeu stratégique majeur pour la suite du projet : renforcer le déploiement territorial du PAEB/ADPME et mettre en œuvre des stratégies d'intervention plus ciblées en faveur des zones sous-représentées, afin d'améliorer l'équité géographique et l'impact des appuis sur l'ensemble du territoire national.

Entrepreneuses soutenues

L'analyse du portefeuille des entrepreneurs accompagnés révèle un déséquilibre significatif en termes de genre : seules 28 % des bénéficiaires sont des femmes, alors que le cadre du projet prévoyait un minimum de 40 %.

Cette sous-représentation illustre un enjeu important d'inclusion et d'égalité des chances dans l'accès aux dispositifs d'accompagnement.



Figure 3 : répartition par sexe des entrepreneurs soutenus

Les facteurs explicatifs peuvent être multiples, allant d'une information et mobilisation insuffisante des entrepreneures à des contraintes socio-économiques ou culturelles qui limitent leur participation. Les nouvelles orientations du projet intégreront explicitement des mesures visant à corriger ce déséquilibre, en renforçant le ciblage, la communication et l'accompagnement spécifique des femmes, afin d'atteindre l'objectif d'inclusion et d'égalité de genre fixé par le projet.

III. Niveau d'exécution consolidée de la composante 1

Au cours de l'année 2025, la mise en œuvre de la Composante 1 du PAEB, dédiée au renforcement des capacités de l'écosystème institutionnel en faveur de l'entrepreneuriat, a permis d'enregistrer des avancées structurantes principalement axées sur la mise en place des prérequis opérationnels du dispositif. Les actions engagées ont porté sur le développement d'outils structurants, la préparation du renforcement des capacités des acteurs clés de l'écosystème, ainsi que la pose des bases du futur déploiement territorial du PAEB/ADPME.

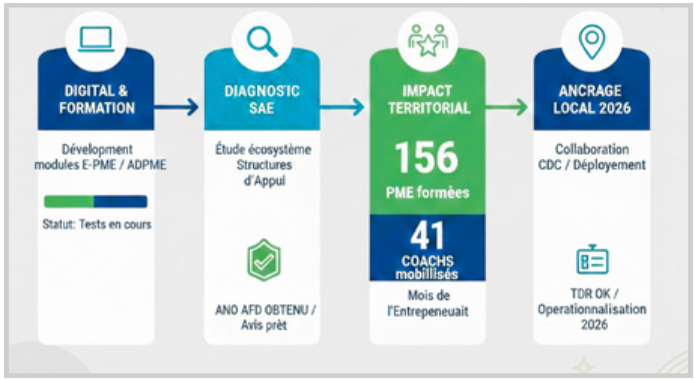


Figure 4 : synthèse des exécutions de la composante 1

Dans ce cadre, le PAEB a appuyé le développement des modules de la plateforme E-PME de l'ADPME, avec une contribution financière de 160 k€ sur les 200 k€ prévus. Les modules financés par le PAEB sont en cours finalisation par le prestataire, et le rapport provisoire a été déposé par le consultant. À ce stade, les phases de tests techniques et fonctionnels sont en cours, afin de garantir la qualité pédagogique et l'opérationnalité des contenus avant leur déploiement effectif.

Par ailleurs, le PAEB a préparé le lancement du processus de renforcement de capacités des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE), à travers l'engagement du processus de recrutement d'un cabinet spécialisé. À ce titre, l'Avis de Non-Objection (ANO) de l'AFD a étéobtenu, l'avis de manifestation d'intérêt a été élaboré et la short-list des cabinets a été constituée. L'étude diagnostique des SAE et de l'écosystème, qui constitue une étape préalable au démarrage effectif des actions de renforcement de capacités, sera réalisée par le cabinet retenu à l'issue de ce processus.

En complément, des avancées ont été enregistrées dans la structuration du schéma opérationnel de déploiement territorial du PAEB/ADPME. À l'occasion du Mois de l'Entrepreneuriat (novembre 2025), le programme a contribué au renforcement des capacités de 156 PME, à travers la mobilisation et la prise en charge des per diem de 41 coachs, permettant de tester les premières modalités d'intervention de proximité et de poser les bases du modèle territorial.

Enfin, dans une logique de proximité et d'ancrage territorial, le PAEB a conduit, en collaboration avec la CCIB, des échanges techniques en vue de l'opérationnalisation du déploiement territorial. Ces travaux ont abouti à l'élaboration des grandes lignes du schéma opérationnel ainsi qu'à la préparation d'un terme de référence (TDR) décrivant les différentes étapes du processus. L'année 2026 sera consacrée à l'officialisation et à la mise en œuvre effective du déploiement territorial, étape clé pour renforcer l'impact du projet au niveau local.

IV. Point d'exécution des aspects transversaux

Les activités relatives aux volets Environnemental, Social et Genre, Passation des Marchés Publics, Administration Financière et Suivi Évaluation se sont déployées de manière transversale au processus d'accompagnement des PME. En 2025, les actions ES&G ont prioritairement porté sur la mise en place des outils de conformité, de gestion des risques et de préparation opérationnelle du cadre ESG du PAEB.

Point d'exécution des aspects Environnement, Social & Genre

Le plan de Travail Annuel prévoyait pour ce volet :

- Des formations généralistes et spécifiques en matière Environnement, Social et Genre prévues dans les Plans d'Action Environnemental et Sociale (PAES) et les Plans d'Action Genre PAG) des entreprises accompagnées ;

- Un appui à l'obtention des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) et des Certificats Environnementaux (CE) pour les entreprises concernées.

☑ ***Formations généralistes et spécifiques E&S et Genre aux entreprises accompagnées réalisées***

Cette activité n'a pas connu de début d'exécution en 2025, en raison de la non-opérationnalisation du cadre ESG du projet sur la période. Les Termes de Référence des formations ont toutefois été élaborés et validés, permettant de poser les bases techniques et pédagogiques de ces interventions. La mise en œuvre des formations E&S et Genre est reprogrammée pour 2026 suivant le cadre ESG révisé.

☑ ***Appui à l'obtention d'EIES et de CE pour les entreprises accompagnées.***

En revanche, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de structuration de la conformité environnementale et sociale du portefeuille. Pour l'ensemble des 160 PME sélectionnées, des Plans d'Action Environnementale et Sociale (PAES) ont été élaborés. Par ailleurs des clauses environnementales et sociales ont été intégrées aux conventions de financement, incluant un Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) visant à assurer la conformité réglementaire et la maîtrise des risques E&S tout au long de la mise en œuvre des activités.

L'évaluation des risques environnementaux et sociaux du portefeuille a permis de classer les PME comme suit :

- **19 PME (11,9 %) en catégorie A, correspondant à des risques E&S élevés ;**
- **21 PME en catégorie B, présentant des risques E&S modérés ;**
- **120 PME en catégorie C, associées à des risques E&S faibles.**

Parmi les 19 PME classées en catégorie A, 13 disposent déjà d'un Certificat de Conformité Environnementale et Sociale (CCES) ou ont fait l'objet d'un audit environnemental et social externe conformément à la réglementation nationale en vigueur. Les 6 autres PME devront finaliser leurs diligences réglementaires au cours de l'année 2026 avec l'appui du dispositif prévu à cet effet.



Figure 5 : Évaluation risques environnementaux et sociaux du portefeuille

Ainsi, sur la période sous revue, les résultats suivants ont été enregistrés dans ce volet :

ACTIONS PREVUES	RESULTATS REALISES
Analyse de la performance E&S et Genre et de la conformité de 160 PME aux Plan d'Action Genre et Plan d'Action E&S du PAEB	**100%** **(Exécuté entièrement)**
Vérification de la conformité de 160 PME vis-à-vis de la règlementation sectorielle de son activité	**100%** **(Exécuté entièrement)**
Analyse des actions en lien avec les diagnostics E&S réalisés par les SAE pour 160 PME	**100%** **(Exécuté entièrement)**
Élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) pour 160 PME	**98,75%** **(158 PEES élaborés sur les 160)**

Tableau 3 : Point d'exécution des actions ES&G

Ces résultats traduisent une première structuration du cadre de gestion des risques E&S du PAEB, qui servira de socle à la montée en charge des actions de formation, d'accompagnement et de mise en conformité réglementaire prévues à partir de 2026.

Point d'exécution du Volet suivi évaluation

Le volet Suivi-Évaluation du PAEB a connu une montée en puissance progressive au cours de l'année 2025, avec une accélération significative à partir du dernier trimestre, consécutive au recrutement d'une ressource dédiée au pilotage du dispositif. Cette dynamique a permis d'engager les actions structurantes nécessaires à la mise en place d'un système de suivi-évaluation cohérent, fonctionnel et aligné sur les exigences du cadre logique du projet.

Dans ce cadre une demande d'Avis de Non-Objection (ANO) a été introduite pour la revue du cadre logique, afin de clarifier et d'aligner les objectifs, résultats et indicateurs du projet. Cette étape a permis de renforcer la cohérence stratégique du dispositif et de poser les bases d'un suivi plus rigoureux de la performance du PAEB.

Par ailleurs, une nomenclature d'identification unique des PME a été définie garantissant un suivi précis, individualisé et homogène de toutes les entreprises accompagnées sur toute la durée du projet.

En complément, des travaux ont été engagés pour la conception et la digitalisation des outils de collecte incluant les données de référence et les données de suivi périodique. Ces outils visent à systématiser la collecte de l'information, à en améliorer la fiabilité et à faciliter son exploitation pour les besoins de pilotage, d'analyse et de reporting.

La structuration d'un cadre de suivi des indicateurs a également été amorcée permettant de mieux organiser le processus de suivi de la performance, d'outiller la prise de décision et de renforcer la lisibilité des résultats du projet.

Enfin, l'ensemble des actions s'inscrit dans la perspective de la mise en place d'un dispositif de feedback des bénéficiaires, destinés à recueillir leurs retours, apprécier la qualité de l'accompagnement et alimenter une logique d'apprentissage et d'amélioration continue.

Ces initiatives combinées posent des bases techniques et organisationnelles d'un système de suivi-évaluation robuste, dont le déploiement opérationnel et la pleine exploitation interviendront à partir de 2026, en appui au pilotage stratégique, à la redevabilité et à la performance globale du PAEB.

Point d'exécution Volet communication

Au cours de l'année 2025, le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB), en synergie avec l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, a mis en œuvre un ensemble d'actions de communication et de visibilité visant à valoriser l'écosystème entrepreneurial béninois au niveau national et international.

Dans ce cadre, trois (03) éditions de l'afterwork **PME Connect** ont été organisées en 2025, constituant des espaces structurés d'information, d'échanges et de mise en relation entre les PME, les institutions publiques et les partenaires techniques :

- **PME Connect – Édition 2 (mars 2025),**
  consacrée aux dispositifs d'accompagnement des PME et au lancement de la plateforme ePME. Cette édition a permis de promouvoir la digitalisation des services de l'ADPME à travers la plateforme ePME, en facilitant l'accès à l'information et aux services d'accompagnement.

- **PME Connect – Édition 3 (mai 2025),**
  organisée autour du thème « La dynamique d'investissement du Port Autonome de Cotonou : opportunités pour les MPME locales ». Cette rencontre a mis en lumière les perspectives économiques offertes par les investissements portuaires et pour les MPME béninoises, avec l'implication du Port Autonome de Cotonou.

- **PME Connect – Édition 4 (juin 2025),**
  axée sur « les dispositifs d'accompagnement de l'ADPME et de l'ABSSA à l'obtention des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) pour les PME/PMI agroalimentaires ». Cette édition a contribué à renforcer la compréhension des exigences réglementaires et des mécanismes d'appui disponibles, en collaboration avec l'Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments, au profit des entreprises du secteur agroalimentaire.

Par ailleurs, le PAEB a assuré une communication ciblée et un accompagnement spécifique de quatre (04) entreprises sur les huit (08) sélectionnées dans le cadre de leur participation aux Rencontres Africa 2025, tenues à Lyon les 5 et 6 juin 2025. Cette action s'est inscrite dans une stratégie de promotion de l'internationalisation des PME béninoises et de valorisation du label « Choose Benin », en partenariat avec notamment le Port Autonome de Cotonou, l'Association des Communes de l'Atlantique et du Littoral et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin.
Les actions de communication ont permis d'accroître la visibilité des entreprises accompagnées, de soutenir leur positionnement lors des rencontres B2B et de renforcer l'image de l'écosystème entrepreneurial béninois à l'international. Enfin, le volet communication a également intégré la production de supports de visibilité, (kakémonos, plaquettes) utilisés lors des événements nationaux et internationaux. Dans l'ensemble, les actions menées en 2025 ont consolidé la visibilité du PAEB, en cohérence avec le Plan de Communication et de Visibilité du projet.

V. Niveau d'atteinte des indicateurs du cadre logique

Le cadre logique du PAEB a récemment reçu l'avis de non-objection de l'AFD. À la suite de cette validation, certains indicateurs ne disposent pas encore de données sur la période de reporting, ce qui explique leur absence ou leur niveau de renseignement partiel dans le présent rapport. Toutefois, les dispositions nécessaires sont en cours pour actualiser le dispositif de suivi et procéder à la mise à jour progressive du tableau de suivi des indicateurs lors des prochains cycles de collecte.

Indicateurs		Périodicité	Type PME	Cible fin du projet	Cible en 2025	Réalisation	Observations
OG1	Nombre de PME soutenues par le PAEB	Mensuelle	Jeunes entreprises	**425**	**225**	**83**	Un plan d'accélération est défini pour compenser le gap
			Entreprises à fort potentiel	**120**	**72**	**40**	Un plan d'accélération est défini pour compenser le gap
OG2	Nombre total d'emplois créés par les entrepreneurs/neuses soutenu(e)s par le PAEB	Mensuelle		**785**	**350**	**-**	Données non encore collectées

OG3	Taux annuel moyen de croissance du chiffre d'affaire des entreprises soutenues par le PAEB	Annuelle		**10%**	-	-	Données non encore collectées
OS11	Taux de couverture géographique d'accès aux services d'appui pour les PME	Annuelle		**100%**	**60%**	**20%**	Le déploiement territorial n'est pas encore effectif à ce stade de mise en œuvre. Sur les cinq zones prévues, le PAEB reste pour le moment opérationnel uniquement à travers son bureau national. L'extension progressive vers les autres zones interviendra en 2026.
OS12	Taux d'exécution programmatique du PTAB de l'ADPME	Annuelle		**50%**		-	Données non encore collectées
OS_2/3_1	Taux de satisfaction des PME accompagnées vis-à-vis de l'accompagnement du PAEB	Annuelle	Tous	**90%**	**70%**	-	Données non encore collectées
OS_2/3_2	Pourcentage de PME accompagnées ayant atteint un niveau de conformité administrative totale (attestation fiscale et Attestation CNSS disponibles, attestation PME).	Annuelle	Jeunes entreprises	**60%**	**40%**	-	Données non encore collectées
			Entreprises à fort potentiel	**80%**	**50%**	-	Données non encore collectées
OS_2/3_3	Taux de survie des PME soutenues par le PAEB dont l'accompagnement a pris fin depuis au moins 24 mois au moment de la mesure.	Annuelle	Jeunes entreprises	**80%**	**80%**	-	Données non encore collectées
			Entreprises à fort potentiel	**90%**		-	Données non encore collectées
R111	Nombre de PME soutenues par l'ADPME	Annuelle		**200**	**200**	-	Données non encore collectées

R112	Nombre de PME issues du déploiement territorial ayant été orientées vers les guichets du PAEB et retenues à l'issue du processus de sélection	Mensuelle		**82**	**25**	**0**	Le déploiement territorial n'est pas encore opérationnel
R121	Pourcentage de SAE déclarant avoir intégré au moins un nouvel outil ou procédé dans leur offre de services à la suite des formations reçues.	Annuelle		**80%**	**50%**	**0%**	
R122	Taux moyen de satisfaction des SAE accompagnées vis-à-vis des formations délivrées par le PAEB	Annuelle		**90%**	**50%**	-	Données non encore collectées
R131	Taux d'exécution financière du PAEB à date	Annuelle		**90%**	**70%**	-	Données non encore collectées
R_2_11	Pourcentage de PME bénéficiaires ayant validé les critères de maturité du stade supérieur (Amorçage vers Croissance vers Fort Potentiel)	Annuelle	Tous	**25%**	**10%**	-	Données non encore collectées
R_2_12	Pourcentage de PME accompagnées déclarant une amélioration significative de leurs pratiques de gestion (comptabilité, marketing, RH) suite à l'appui des SAE	Annuelle	Tous	**90%**	**50%**	-	Données non encore collectées

R_2/3_21	Nombre cumulé de PME accompagnées par un appui financier du PAEB	Mensuelle	Jeunes entreprises	255 dont au moins 40% soit 102 PME appartenant à des femmes	**153**	63 dont 11% soit 7 PME appartenant à des entrepreneuse	Au regard du faible taux actuel de PME dirigées par des femmes, une réorientation stratégique est engagée afin de corriger le déséquilibre observé en début de mise en œuvre. Les prochaines cohortes feront l'objet d'un ciblage prioritaire des entreprises féminines, avec une communication dédiée et un ancrage renforcé auprès des réseaux de femmes entrepreneures. L'objectif est de porter à au moins 50 % la part de femmes dans les nouvelles PME accompagnées, afin de converger vers la cible de 40 % fixée par le projet.
			Entreprises à fort potentiel	40 dont au moins 40% soit 16 PME appartenant à des femmes	**24**	8 dont 0 entrepreneuse	
R_2/3_22	Volume de financements octroyés aux PME	Mensuelle	Jeunes entreprises	**9,098,123,590**	**3,825,000,000**		
			Entreprises à fort potentiel	**7,845,245,720**	**2,880,000,000**		
R_2/3_24	Taux de remboursement des crédits accordés	Mensuelle	Tous	**80%**	**40%**	-	Données non encore collectées
R_2/3_31	Pourcentage de PME ayant mis en œuvre au moins 80% des mesures correctives et des outils de gestion issus de leurs PGES respectifs	Mensuelle	Tous	**90%**	**50%**	**0%**	Données non encore collectées

R_2/3_32	Proportion de PME ayant mis en œuvre des actions/outils/organisations issus de leur PAG respectifs	Mensuelle	Tous	**90%**	**50%**	-	Cet indicateur n'est pas encore mesurable à ce stade, les PGES des PME n'ayant pas encore été élaborés. Leur élaboration est prévue au cours de l'année 2026, après le recrutement du cabinet chargé d'accompagner le processus. Le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives et des outils de gestion pourra démarrer à l'issue de cette étape structurante.
R_2/3_33	Nombre de PME ayant obtenu leur Certificat de Conformité Environnementale et Sociale (CCES) délivré suite aux études EIES financées par le PAEB	Mensuelle	Tous	**24**	**10**	**0**	

VI. Activités spécifiques mises en œuvre en marge du PTAB 2025

Des activités non prévues dans le PTAB 2025 ont été engagées au cours du premier semestre, après obtention de l'Avis de Non-Objection du bailleur, dans le cadre de la mise en œuvre du PAEB. Ces interventions, alignées avec les objectifs stratégiques du projet, concernent principalement (i) l'implication du PAEB dans la phase pilote du projet « 1000 Aviculteurs » et (ii) la participation du PAEB aux Rencontres Africa 2025, tenues à Lyon les 5 et 6 juin 2025.

☑ ***Projet 1000 Aviculteurs***

Le projet « 1000 Aviculteurs » prévoit la mise en œuvre de deux cohortes de jeunes aviculteurs, dont une première cohorte pilote de 100 bénéficiaires. Le PAEB a été initialement associé à cette phase pilote dans une logique de soutien à l'amorçage et de structuration des jeunes entrepreneurs du secteur avicole.

En 2025, l'implication du PAEB s'est limitée à des travaux préparatoires, portant notamment sur la formalisation des bénéficiaires, l'identification et la sécurisation foncière des sites individuels et collectifs, ainsi que l'élaboration du manuel d'opérationnalisation du projet.

Toutefois, à la suite des ajustements intervenus dans le cadre de la relance opérationnelle du PAEB au dernier trimestre 2025, une revue des marges de manœuvre financières et des priorités stratégiques a conduit à ne pas confirmer la mobilisation des 100 places d'appui à l'amorçage au profit de la phase pilote. Cette décision s'explique par une capacité financière réévaluée, une concentration sectorielle déjà élevée du portefeuille, et la nécessité de recentrer les interventions du PAEB sur ses objectifs prioritaires.

Le PAEB demeure néanmoins ouvert à l'exploration de modalités de collaboration alternatives, notamment sous forme d'appuis non financiers, ou de toute autre approche compatible avec les orientations stratégiques du projet.

☑ ***Les Rencontres Africa 2025***

Les Rencontres Africa 2025, tenues à Lyon les 5 et 6 juin 2025, constituent un événement majeur du dialogue économique entre la France et les pays africains. Dans ce cadre, la participation du PAEB, mis en œuvre par l'ADPME, s'est inscrite dans la stratégie de soutien à l'internationalisation des PME béninoises et de promotion de l'écosystème entrepreneurial national.

La mission visait à renforcer la visibilité du label « Choose Benin », à promouvoir les initiatives publiques en faveur des PME et à offrir aux entreprises participantes des opportunités de réseautage, de partenariats et de transferts de compétences. La délégation béninoise, conduite par le Directeur Général de l'ADPME, comprenait quatre (04) cadres pour l'encadrement institutionnel. Sur les huit (08) entreprises initialement sélectionnées, quatre (04) ont effectivement pris part à l'événement.

Durant les deux jours du forum, le stand « Choose Benin », cofinancé par l'ADPME et ses partenaires stratégiques, a constitué un espace central de visibilité et d'échanges. Plusieurs rencontres B2B ont été organisées entre les entreprises béninoises et des partenaires européens, permettant d'initier des perspectives concrètes de collaboration, notamment en matière de contrats commerciaux, de transferts de technologies et de financement de projets. Ces échanges ont contribué à renforcer le positionnement international des PME accompagnées et l'attractivité de l'écosystème entrepreneurial béninois.

VII. Situation financière et exécution budgétaire (PTBA 2025)

Situation financière globale du PTBA 2025

Au 31 décembre 2025, la planification budgétaire du PAEB s'établissait à 8 208 463 €, correspondant aux prévisions d'activités programmées au titre de l'exercice 2025.

Les dépenses exécutées s'élèvent à 4 190 802 €, soit un taux global d'exécution financière de 51,1 %, laissant un solde disponible de 4 017 662 € pour la poursuite des activités.

Ce niveau d'exécution traduit une montée en charge progressive du projet, cohérente avec le démarrage opérationnel effectif intervenu en 2024 et les ajustements organisationnels observés en 2025.

Répartition de l'exécution par source de financement

L'exécution financière du PTBA 2025 est principalement portée par le Crédit AFD, qui représente environ 64 % des décaissements, contre 51 % pour la Subvention UE et 24 % pour la Subvention AFD.

Cette structure reflète la logique de mise en œuvre du PAEB, dans laquelle :

Le Crédit AFD finance principalement les appuis financiers directs aux entreprises (subventions d'amorçage, avances remboursables), traduisant une forte capacité d'absorption financière et opérationnelle sur les activités concernées.

lLes Subventions AFD et UE soutiennent prioritairement les activités d'accompagnement non financier et de renforcement de l'écosystème institutionnel. Or, ces activités sont à ce stade faiblement consommées, générant un déséquilibre dans l'exécution financière du projet.

Exécution financière par source de financement

Source de financement	Budget (€)	Exécution (€)	Taux d'exécution (%)
Subvention AFD	2 236 670	543 311	24%
Subvention UE	1 433 436	733 192	51%
Crédit AFD	4 538 357	2 914 298	64%
TOTAL	8 208 463	4 190 802	51%

Taux d'exécution financière par composante (réalisé vs prévisions 2025)

Composante 1 – Renforcement de l'écosystème institutionnel

Budget : 1307 076 € | Exécution : 605 484 € | Taux d'exécution : 46 %

Sous-composante	Budget (€)	Exécution (€)	Subv AFD (€)	Subv UE (€)	Crédit AFD (€)	Taux (%)
1.1 Capacité UGP, MOA, MOD	533 720	164 999	0	164 999	0	31%
1.2 SAE et acteurs financiers	166 667	0	0	0	0	0%
1.3 Suivi et coordination globale	606 689	440 485	440 485	0	0	73%

L'exécution est principalement concentrée sur la sous-composante 1.3 (suivi et coordination du projet), qui affiche un taux de 73 %. À l'inverse, les activités de renforcement des SAE (1.2) n'ont pas encore été exécutées à fin 2025, leur déploiement ayant été reprogrammé pour le premier trimestre 2026 dans le cadre de la relance opérationnelle du projet.

Composante 2 – Appui aux jeunes entreprises

Budget : 3 251 557 € | Exécution : 1 150 335 € | Taux d'exécution : 35 %

Sous-composante	Budget (€)	Exécution (€)	Subv AFD (€)	Subv UE (€)	Crédit AFD (€)	Taux (%)
2.1 Appui non financier	1 373 172	302 386	783 346	302 386	589 826	22%
2.2 Appui financier	1 878 385	847 949	0	847 949	1 878 385	45%

L'exécution demeure contrastée entre :

- l'appui financier (45 %), principalement porté par le Crédit AFD ;
- l'appui non financier (22 %), dont le déploiement a été plus progressif en 2025.

Ces résultats traduisent un décalage de rythme entre les deux volets, l'effort d'exécution s'étant davantage concentré sur les décaissements d'appuis financiers en 2025. Le renforcement et l'accélération de l'accompagnement non financier constitueront ainsi un axe prioritaire en 2026.

Composante 3 – Appui aux PME à fort potentiel

Budget : 3 415 561 € | Exécution : 2 344 702 € | Taux d'exécution : 69%

Sous-composante	Budget (€)	Exécution (€)	Subv AFD (€)	Subv UE (€)	Crédit AFD (€)	Taux (%)
3.1 Appui non financier	755 589	278 353	198 646	278 353	556 944	37%
3.2 Appui financier	2 659 972	2 066 349	0	2 066 349	2 066 349	78%

Cette composante affiche le meilleur niveau d'exécution du projet, porté par la forte mobilisation du Crédit AFD (78 % sur l'appui financier). L'appui non financier progresse plus lentement (37 %), du fait d'un séquencement opérationnel ayant priorisé, en 2025, la mise en œuvre des appuis financiers. L'année 2026 visera à rééquilibrer l'exécution en intensifiant l'accompagnement non financier, afin de consolider les trajectoires de performance des entreprises et maximiser l'impact des financements accordés.

Composante 4 – Moyens Généraux

Budget : 165 085 € | Exécution : 90 281 € | Taux d'exécution : 55%

Sous-composante	Budget (€)	Exécution (€)	Subv AFD (€)	Subv UE (€)	Crédit AFD (€)	Taux (%)
4.1 Audit, M&E et support	90 000	29 068	90 000	0	0	32%
4.2 Communication et visibilité	75 085	61 212	75 085	0	0	82%

Les dépenses ont été majoritairement engagées sur la communication et la visibilité (82 %), tandis que les activités d'audit et de suivi-évaluation présentent un niveau d'exécution plus modéré, en lien avec l'absence de personnel dédié au volet suivi-évaluation et la réalisation d'un audit 2024.

Synthèse générale

L'analyse transversale met en évidence une forte orientation des dépenses vers les bénéficiaires finaux, avec 83 % des ressources exécutées consacrées aux appuis directs aux entreprises.

Cette configuration traduit la priorité donnée aux appuis financiers, tout en révélant une sous-consommation temporaire des lignes dédiées aux études, formations et accompagnements non financiers, qui devront faire l'objet d'une accélération ciblée en 2026.

Le taux d'exécution de 51,1 % est cohérent avec une année de transition et de relance.

Au-delà des niveaux d'exécution observés, l'analyse financière du PTBA 2025 met en évidence une trajectoire de déploiement globalement cohérente avec la dynamique opérationnelle du projet au cours de l'exercice. La prédominance des financements orientés vers les appuis directs aux entreprises, conjuguée à la disponibilité de marges financières significatives sur les lignes de subvention, traduit à la fois les choix stratégiques opérés en 2025 et le potentiel d'accélération encore mobilisable.

Ces éléments confirment que l'année 2025 a davantage constitué une phase d'ajustement et de préparation, que de pleine exécution à régime de croisière.

Les enseignements tirés des analyses opérationnelles, transversales et financières convergent vers un même constat : les fondations du PAEB sont désormais stables, et les conditions sont réunies pour une montée en puissance effective à compter de l'exercice 2026.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'exercice 2025 a permis au Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB) de consolider progressivement son dispositif de mise en œuvre, dans un contexte marqué par un ralentissement du rythme global d'exécution au cours du second semestre. Les analyses présentées dans le présent rapport mettent en évidence une année de transition, au cours de laquelle les principaux fondements de gouvernance, opérationnels et financiers du projet ont été posés ou renforcés.

Sur le plan opérationnel, la mise en place des prérequis, notamment au niveau de la structuration des outils et cadres de mise en œuvre, des chantiers structurants et de la réorganisation opérationnelle du dispositif d'accompagnement, a constitué une étape déterminante. Les composantes métiers dédiés à l'appui direct aux entreprises ont maintenu la dynamique d'intervention, même si les niveaux de réalisation observés à fin 2025 demeurent inférieurs aux cibles initialement planifiées. Ces écarts s'expliquent principalement par des facteurs endogènes et organisationnels identifiés et documentés, dont les effets ont commencé à être corrigés en fin d'exercice.

Dans l'ensemble, l'année 2025 a permis de poser des bases solides pour une montée en puissance effective du PAEB. Les chantiers structurants engagés, la clarification des priorités stratégiques et la disponibilité de ressources financières significatives, notamment sur les subventions AFD et UE, créent des conditions favorables pour une accélération de l'exécution opérationnelle et financière à compter de 2026.
À ce titre, l'exercice à venir devra être résolument orienté vers la concrétisation des appuis, l'absorption accrue des ressources disponibles et le renforcement de l'impact du projet au service du développement de l'entrepreneuriat et des PME sur l'ensemble du territoire national.

Annexe 1 : Tableau : Exécution financière détaillée du PTAB 2025 au 31 décembre 2025 (par source de financement en €)

LIGNES BUDGETAIRES PTBA 2025			Budget 2025 (c)	Exécution au 31 décembre 2025	Source de financement			Taux d'exécution financière
			Subv AFD			Subv UE	Crédit AFD	
Sous-composante 1.1 : Renforcement des capacités de l'UGP, de la MOA et de la MOD (ADPME) Résultat 1.1: Le MPMEPE et l'ADPME sont renforcés dans leurs capacités et exécutent le projet de manière efficace avec des ressources et organisation adaptées.			533 720	164 999	-	164 999	-	31%
Action 1.1.1 Assistance technique globale (pilotage EF) pour la MOA, l'UGP et l'appui à la structuration et à l'opérationnalisation de l'ADPME, globalement et spécifiquement au projet (incluant procédures E&S, Genre, mise en place du système de suivi-évaluation, opérationnalisation des composantes 2 et 3)		-	-	-	-	-	0%	
1.1.1.1.	Assistance technique globale (pilotage EF) pour la MOA, l'UGP et l'appui à la structuration et à l'opérationnalisation de l'ADPME, globalement et spécifiquement au projet (incluant procédures E&S, Genre, mise en place du système de suivi-évaluation, opérationnalisation des composantes 2 et 3)	-	-	-	-	-	0	
Action 1.1.2 Mise en place de la plateforme E-PME de l'ADPME		400 000	156 759	-	156 759	-	39%	
1.1.2.1.	Appui au développement des modules sur la plate forme E-PME de l'ADPME	400 000	156 759	-	156 759	-	39%	
Action 1.1.3 Missions de production intellectuelle : études, analyses et veilles stratégiques pour orientation stratégique et économique du dispositif		83 720	-	-	-	-	0%	

1.1.3.1	Réalisation d'étude	70 000	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Recrutement d'un assistant juridique	13 720	-	-	-	-	0%
Action 1.1.4. Assistance technique à la CCIB/ADPME pour déploiement territorial du dispositif		50 000	8 240	-	8 240	-	16%
1.1.4.1.	Structuration d'un schéma opérationnel de déploiement territorial du PAEB	50 000	8 240	-	8 240	-	16%
1.1.4.2.	Mise en œuvre du schéma opérationnel de déploiement territorial du PAEB (formation, coaching, sensibilisation..)	-	-	-	-	-	0%
Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités et accompagnement des SAE et acteur(s) financier(s) de l'écosystème Résultat 1.2: Les SAE impliquées dans le projet et les SAE les plus pertinentes de l'écosystème entrepreneurial béninois sont renforcées dans leurs capacités.		166 667	-	-	-	-	0%

Action 1.2.1 Diagnostic, sélection, évaluation des SAE accompagnées par le PAEB, puis programme de renforcement de capacité des SAE sélectionnées		166 667	-	-	-	-	0%
1.2.1.1.	Réalisation d'une étude diagnostique de l'écosystème des SAE et d'élaboration de leur plan de renforcement de capacité	166 667	-	-	-	-	0%
1.2.1.2.	Mise en œuvre des recommandations du diagnostic et du plan de renforcement des capacités	-	-	-	-	-	0%
Sous-composante 1.3 : Suivi et coordination globale du projet Résultat 1.3 : Le projet est opérationnalisé et suivi, respecte son calendrier et son budget, sa coordination globale et technique est assurée		606 689	440 485	440 485	-	-	73%
Action 1.3.1. Sélection selon procédures de passation de marché d'un cabinet RH international pour assister la MOA dans le recrutement des postes-clés de la cellule de coordination et de suivi		-	-	-	-	-	0%
1.3.1.1.	Frais de recrutement des membres de l'UGP	-	-	-	-	-	0%

Action 1.3.2 Equipe de l'Unité de Gestion du Projet		357 724	261 457	261 457	-	-	73%
1.3.2.1.	Salaires, cotisations sociales et assurance maladie au titre de 2024	357 724	261 457	261 457	-	-	73%
Action 1.3.3 Fonctionnement de l'UGP et du dispositif		248 965	179 028	179 028	-	-	72%
1.3.3.1.	Matériels roulants au profit de l'UGP	91 469	90 978	90 978	-	-	99%
1.3.3.2.	Carburant au profit de l'UGP	22 000	3 136	3 136	-	-	14%
1.3.3.3.	Fournitures, matériels et mobiliers pour l'UGP (Fournitures, matériels et mobiliers de bureau, matériels et accessoires informatiques...etc)	29 421	13 088	13 088	-	-	44%
1.3.3.4.	Logiciels de gestion et formations des utilisateurs (Logiciel de gestion financière et comptable, Pack Office...)	27 500	30 742	30 742	-	-	112%

1.3.3.5.	Indemnités kilométriques ou location de véhicules au titre de 2024	4 000	2 210	2 210	-	-	55%
1.3.3.6.	Diverses activités et réparations d'immobilier, véhicules, et divers	7 287	1 906	1 906	-	-	26%
1.3.3.7.	Frais de missions à l'intérieur et à l'extérieur	39 288	4 520	4 520	-	-	12%
1.3.3.8.	Organisation d'événements et réunions (Revues périodiques, comité de pilotage...ETC)	20 000	13 238	13 238	-	-	66%
1.3.3.9	Organisation d'événements et réunions (Revues périodiques, comité de pilotage...ETC)	8 000	2 134	2 134	-	-	27%
1.3.3.10	Loyer et charges locatives	-	17 074	17 074	-	-	0%
Composante 2 : Appui au développement des jeunes entreprises ;		3 251 557	1 150 335	-	302 386	847 949	35%

Sous-composante 2.1 : Appui non financier aux jeunes entreprises Résultat 2.1 : Un dispositif d'appui non financier performant et adapté aux jeunes entreprises a permis d'octroyer des services non financiers à 425 de ces jeunes entreprises. Cet objectif de 425 jeunes entreprises au total sera distribué annuellement et, pour chaque année, entre les prestataires opérationnels de la composante ;		1 373 172	302 386	-	302 386	-	22%
Action 2.1.1 Déploiement par l'UGP, avec l'appui de ses prestataires opérationnels réguliers les processus opérationnels afin d'apporter un appui non financier aux jeunes entreprises		1 373 172	302 386	-	302 386	-	22%
2.1.1.1	Appui non financier à cent cinquante (150) jeunes entreprises (Rémunérations des SAE chargées de l'accompagnement des PME et coûts des prestations externes)	1 089 172	302 386		302 386		28%
2.1.1.2	Formations (prévues aux PAES et PAG) généralistes et spécifiques E&S et Genre aux entreprises accompagnées	188 000	-				0%
2.1.1.3	Appui à l'obtention d'EIES et de CE pour les entreprises accompagnées	96 000	-				0%

Sous-composante 2.2 : Appui financier aux jeunes entreprises Résultat 2.2 : Un dispositif d'appui financier performant et adapté aux jeunes entreprises a permis d'octroyer des subventions d'amorçage à 180 de ces jeunes entreprises et des prêts à faible taux à 75 de ces jeunes entreprises.		1 878 385	847 949	-	-	847 949	45%
Action 2.2.1 Déploiement par l'UGP, avec l'appui de ses prestataires opérationnels réguliers et de ses prestataire(s) financier(s) sur toute la durée du projet les processus opérationnels afin d'apporter un appui financier en subvention d'amorçage et en prêt à taux zéro ou faible,		1 878 385	847 949	-	-	847 949	45%
2.2.1.1.	Appui financier en subvention d'amorçage au titre de 2025 pour soixante-douze (72) MPME en phase d'amorçage	933 964	703 199			703 199	75%
2.2.1.2.	Appui financier en avance remboursable au titre de 2025 pour trente (30) MPME en phase de croissance	944 422	144 751			144 751	15%
Composante 3 : Appui aux PME à fort potentiel.		3 415 561	2 344 702	12 545	265 807	2 066 349	69%
Sous-composante 3.1 : Appui non financier aux PME à fort potentiel Résultat 3.1 : Des PME à fort potentiel sont identifiées et accompagnées dans leur développement par un service non financier personnalisé		755 589	278 353	12 545	265 807	-	37%

Action 3.1.1 Déploiement des processus opérationnels par l'UGP et les prestataires opérationnels sur toute la durée du programme,		755 589	278 353	12 545	265 807	-	37%
3.1.1.1	Appui non financier à qurante cinq (45) entreprises à haut potentiel : (Rémunérations des SAE chargées de l'accompagnement des PME et rémunérations externes)	667 589	278 353	12 545	265 807		42%
3.1.1.2	Formations (prévues aux PAES et PAG) généralistes et spécifiques E&S et Genre aux entreprises accompagnées	52 000	-				0%
3.1.1.3	Appui à l'obtention d'EIES et de CE pour les entreprises accompagnées	36 000	-				0%
Sous-composante 3.2 : Appui financier aux entreprises à fort potentiel Résultat 3.2 : Des PME à fort potentiel sont identifiées et accompagnées dans leur développement par un service financier personnalisé		2 659 972	2 066 349	-	-	2 066 349	78%
Action 3.2.1 Déploiement par l'UGP, avec l'appui de ses prestataires opérationnels réguliers et de ses prestataire(s) financier(s) sur toute la durée du projet les processus opérationnels afin d'apporter un appui financier en avances remboursables pour les entreprises à fort potentiel		2 659 972	2 066 349	-	-	2 066 349	78%
3.2.1.1.	Appui financier en avance remboursable au titre de 2024 pour Cinq (05) MPME à fort potentiel	2 659 972	2 066 349			2 066 349	78%

Composante 4: Moyens Généraux		165 085	90 281	90 281	-	-	55%
Sous-composante 4.1 : Audit, M&E et support Résultat 4.1 : Le dispositif de S&E du PAEB est conçu, mis en place et déployé pour une production efficace de l'information Résultat 4.1 : Le dispositif de S&E du PAEB est conçu, mis en place et déployé pour une production efficace de l'information		90 000	29 068	29 068	-	-	32%
Action 4.1.1 Mise en place et déploiement du dispositif de suivi/ évaluation du PAEB		90 000	29 068	29 068	-	-	32%
4.1.1.1.	Déploiement du dispositif du Suivi & Evaluation du PAEB (Etude de référence des indicateurs, Collecte de données de base, mission terrain de suivi-évaluation,)	60 000	-				0%
4.1.1.2.	Réalisation des Audits et évaluation à mi-parcours au titre des années 2023 et 2024 du PAEB	30 000	29 068	29 068			97%
Sous-composante 4.2 : Communication et visibilité Résultat 4.2: Une meilleure visibilité des actions et des résultats du PAEB est assurée		75 085	61 212	61 212	-	-	82%
Action 4.2.1 Gestion de la communaication du Projet		75 085	61 212	61 212	-	-	82%
4.2.1 .1.	Action de communication et de visibilité du PAEB conformément au PCV du Projet	75 085	61 212	61 212			82%
Imprévus et disponible pour facilités SF et SnF auprès des entreprises		69 183	-	-	-	-	0%
TOTAL		8,208,463	4 190 802	543 311	733 192	2 914 298	51,055%
