30 JUIN 2026

PAEB
PROJET D'APPUI À L'ENTREPRENEURIAT AU BÉNIN

ADPME
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Rapport semestriel du PAEB

Projet d'appui à l'entrepreneuriat au Benin

Crédit photo : PME WAPACK Industries de la composante 3 accompagnée par le PAEB

Résumé exécutif

Le premier semestre 2026 du Programme d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB) a été marqué par une montée en puissance progressive de la mise en œuvre et la consolidation des principaux dispositifs opérationnels du programme.

Au cours de la période, le PAEB a poursuivi le renforcement de son portefeuille de PME, accéléré le déploiement des appuis techniques et financiers et préparé plusieurs chantiers structurants, notamment le déploiement territorial du dispositif, le renforcement du suivi des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE) et l'amélioration des outils de pilotage et de suivi des résultats.

Le semestre a également permis de consolider le dialogue avec les partenaires techniques et financiers, en particulier l'Agence Française de Développement (AFD), afin de sécuriser les principaux prérequis opérationnels et de préparer les conditions d'une accélération plus soutenue au second semestre.

L'analyse des performances met en évidence des avancées significatives en matière de structuration du portefeuille PME, de renforcement des mécanismes de reporting et d'intégration des dimensions transversales liées au genre, à l'inclusion territoriale, à l'environnement et au suivi des résultats.

Des points d'attention subsistent, notamment en matière de rythme d'exécution de certaines activités structurantes et de consolidation des outils de mesure des résultats. Ces enjeux font l'objet d'un suivi rapproché et de mesures d'ajustement destinées à accompagner la montée en puissance du programme.

À fin juin 2026, le taux d'exécution physique du PAEB s'établit à **51,09 %**, tandis que le taux d'exécution financière atteint **40,53 %** (incluant les virements en attente de positionnement bancaire), traduisant une dynamique d'exécution en progression.

Le second semestre 2026 devra constituer une phase d'accélération maîtrisée, avec un accent particulier sur l'amélioration des décaissements, le lancement effectif du déploiement territorial, la poursuite des appuis aux PME et le renforcement de la mesure des résultats et de l'impact des interventions.

Le premier semestre aura ainsi permis de consolider les fondations opérationnelles du programme ; le second devra transformer cette dynamique en résultats plus visibles, mesurables et durables au bénéfice des entrepreneurs béninois.

Introduction

Crédit photo : PME WAPACK Industries de la composante 3 accompagnée par le PAEB

01 INTRODUCTION

Le Programme d'Appui à l'Entrepreneuriat au Bénin (PAEB) vise à renforcer la structuration, la compétitivité et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises béninoises. Il s'inscrit dans les priorités nationales de développement du secteur privé et de soutien à l'entrepreneuriat, avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD) et de l'Union européenne.

Le présent rapport d'avancement semestriel présente le niveau de mise en œuvre du PAEB sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2026. Il s'inscrit dans le dispositif de pilotage, de suivi et de redevabilité du programme, conformément aux exigences de reporting convenues avec les partenaires techniques et financiers.

La consolidation des informations repose sur les données produites l'Unité de Gestion du Projet (UGP), les experts en charge du portefeuille PME, les Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE), ainsi que le dispositif de suivi-évaluation du programme.

Le rapport propose une lecture structurée du semestre, en articulant l'analyse stratégique de la période, le niveau d'exécution du programme, l'évolution du portefeuille de PME accompagnées, l'état d'avancement des composantes, les dimensions transversales, l'exécution financière, les principaux risques identifiés ainsi que les perspectives pour le semestre suivant.

Le premier semestre 2026 a constitué une étape importante dans la montée en puissance du PAEB. Il a permis de passer progressivement d'une logique de consolidation des prérequis opérationnels à une dynamique davantage orientée vers l'exécution, la structuration du portefeuille et la préparation des leviers d'accélération.

Trois évolutions majeures caractérisent cette période.

- **Premièrement, le portefeuille de PME accompagnées a connu une forte montée en puissance, passant de 160 PME en décembre 2025 à 376 PME à fin juin 2026,** soit une augmentation nette de **216 entreprises (+135 %).** Cette progression traduit l'intensification des efforts d'identification, de sélection, d'instruction et de suivi des entreprises, avec une attention particulière portée à la qualité des projets, aux besoins réels d'accompagnement et aux perspectives d'accès au financement.
- **Deuxièmement, les appuis non financiers et financiers ont été repositionnés comme des leviers complémentaires de transformation des PME.** Les appuis techniques déployés par les SAE et les appuis externes spécialisés visent à répondre à des besoins concrets : structuration du modèle économique, renforcement des capacités de gestion, formalisation des plans de croissance, amélioration de la gouvernance, accès au marché, normalisation, préparation à l'accès au financement bancaire et renforcement de la capacité d'absorption des financements.
- **Troisièmement, plusieurs chantiers structurants ont été préparés afin de soutenir l'accélération du programme au second semestre.** Ils concernent notamment le déploiement territorial du PAEB, en lien avec l'ADPME et la CCIB, le programme de renforcement des capacités des SAE, l'amélioration des outils de suivi-évaluation, l'accélération des décaissements et la fiabilisation des données de suivi.

Le semestre a également permis d'identifier plusieurs leviers d'amélioration pour renforcer la trajectoire d'exécution du programme. Ils portent notamment sur l'accélération de l'exécution financière, et la fluidification des circuits de validation. Ces éléments font désormais l'objet d'un suivi rapproché, afin de soutenir une mise en œuvre plus rapide et mieux pilotée au second semestre.

Ainsi, le premier semestre 2026 doit être lu comme une période de montée en puissance opérationnelle du PAEB. Au-delà des niveaux d'exécution atteints à fin juin, il a permis d'élargir significativement le portefeuille de PME accompagnées, et d'identifier les ajustements nécessaires pour accélérer l'exécution au second semestre. Cette dynamique doit permettre de rapprocher progressivement **la trajectoire de mise en œuvre des objectifs du PTAB 2026.**

Analyse du portefeuille PME et exécution par composante

Crédit photo : PME CLINIQUE DES PERLES de la composante 2.1 accompagnée par le PAEB

02 | Analyse du portefeuille PME et exécution par composante

Le premier semestre 2026 confirme l'entrée du PAEB dans une phase de consolidation opérationnelle et de montée en puissance plus visible de ses résultats. La période sous revue ne se caractérise plus uniquement par la mise en place des outils et des mécanismes d'intervention ; elle traduit désormais une progression tangible du portefeuille, une meilleure adaptation des appuis à la maturité des entreprises et une exécution par composante progressivement plus démonstrative.

À fin juin 2026, le portefeuille consolidé du programme s'établit à **376 PME**, contre 160 à fin 2025, soit une **progression de 135 %.** Cette évolution traduit un changement d'échelle significatif du dispositif. Elle témoigne de la capacité du PAEB à accompagner un volume croissant d'entreprises tout en renforçant la profondeur de ses interventions, la lisibilité de ses cohortes et l'articulation entre accompagnement technique, appui financier et préparation des entreprises à la croissance.

2.1. Lecture transversale du portefeuille PME

Graphique 2.1.1. Rééquilibrage territorial et progression de l'inclusion genre

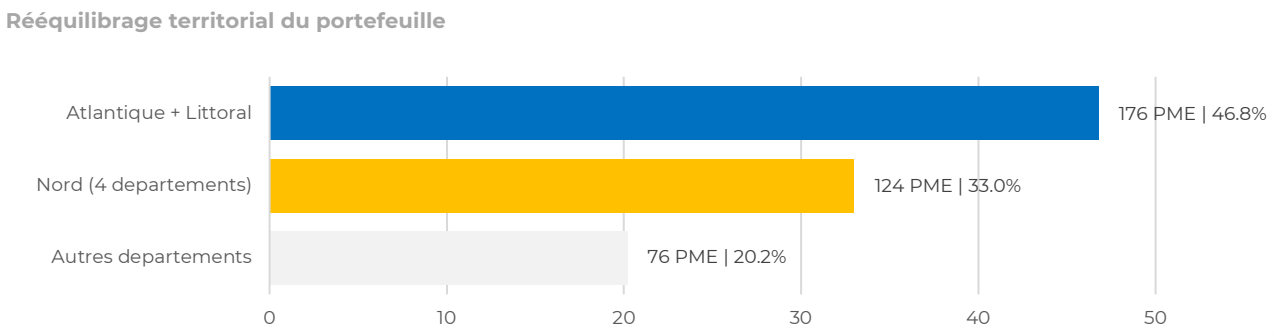

Repère de lecture : 124 PME sont désormais présentes dans le Nord, dont 94 nouvelles PME intégrées entre janvier et juin 2026

***Graphique 2.1.2.* Évolution de la part des PME dirigées par des femmes**

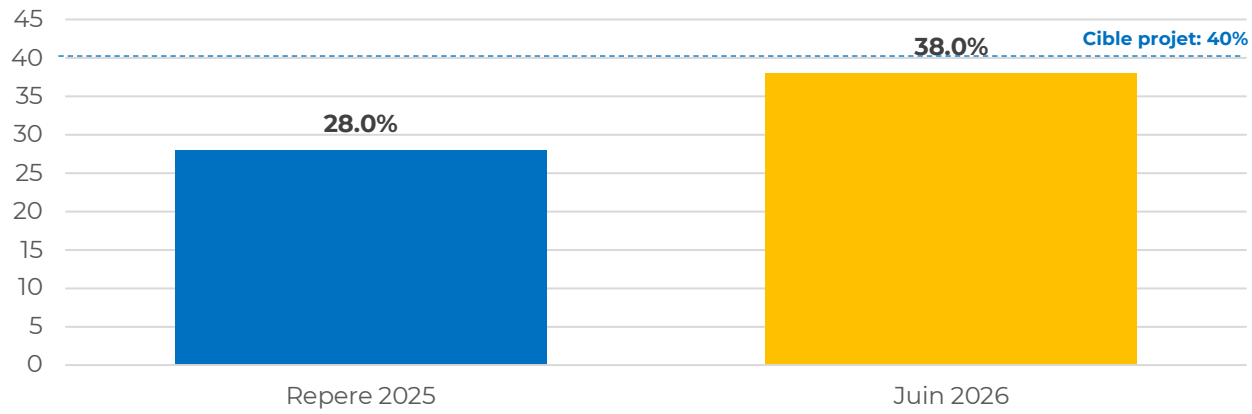

143 femmes cheffes d'entreprise à fin juin

Source: données PAEB au 30/06/2026

L'analyse transversale du portefeuille montre que la montée en puissance du PAEB s'accompagne d'un rééquilibrage progressif des résultats au profit d'une meilleure inclusion territoriale et d'un renforcement de l'entrepreneuriat féminin. Cette évolution est particulièrement importante dans la mesure où elle traduit un portefeuille moins concentré, plus diversifié et davantage aligné avec les ambitions du programme en matière d'accès élargi aux opportunités d'accompagnement.

Sur le plan territorial, le portefeuille demeure fortement représenté dans les départements de l'Atlantique et du Littoral, qui totalisent **176 PME, soit 46,8 %** des entreprises accompagnées à fin juin 2026. Toutefois, cette centralité s'atténue progressivement au profit d'une présence plus affirmée dans les départements du Nord. Les quatre départements septentrionaux (Alibori, Atacora, Borgou et Donga) regroupent désormais **124 PME, soit 33,0 %** du portefeuille. Parmi elles, 94 correspondent à de nouvelles intégrations réalisées entre janvier et juin 2026, confirmant que le rééquilibrage territorial observé ne relève pas d'un simple effet de stock, mais bien d'une dynamique récente, volontaire et stratégiquement assumée.

Une évolution similaire est observée en matière de genre. À fin juin 2026, le portefeuille compte **143 femmes cheffes d'entreprise**, représentant **38 % des PME accompagnées**, contre **28 % au repère 2025**. Cette progression de dix points constitue une avancée notable et rapproche le programme de sa cible de 40 %. Elle témoigne de l'ancrage progressif des enjeux d'inclusion dans les mécanismes de sélection et d'accompagnement du PAEB.

Dans son ensemble, cette lecture transversale confirme que **le portefeuille du PAEB gagne en équilibre.** Des marges de progression subsistent pour consolider la présence du programme dans certaines zones et poursuivre les efforts en faveur des femmes entrepreneures ; néanmoins, le semestre permet déjà d'observer une inflexion positive et structurante, qui constitue un acquis important pour la suite de la mise en œuvre.

Par ailleurs, la structure du portefeuille met en évidence la coexistence de cohortes relevant de l'ancien schéma opérationnel (18 mois d'appui) et du nouveau dispositif déployé depuis janvier 2026 (12 mois d'appui). Les PME suivies depuis trois à six mois constituent aujourd'hui le noyau principal du portefeuille (134 PME), tandis que 78 entreprises dépassent 18 mois d'accompagnement.

À ce stade, **36 PME ont formellement achevé leur parcours** et sont sorties du dispositif. Les autres entreprises arrivées à échéance demeurent en cours de finalisation de leurs plans d'accompagnement et de clôture administrative, ce qui appelle une attention particulière au second semestre afin d'assurer un meilleur alignement entre les échéanciers prévus et les sorties effectives du portefeuille.

Graphique 2.1.3 Ancienneté des PME dans le dispositif

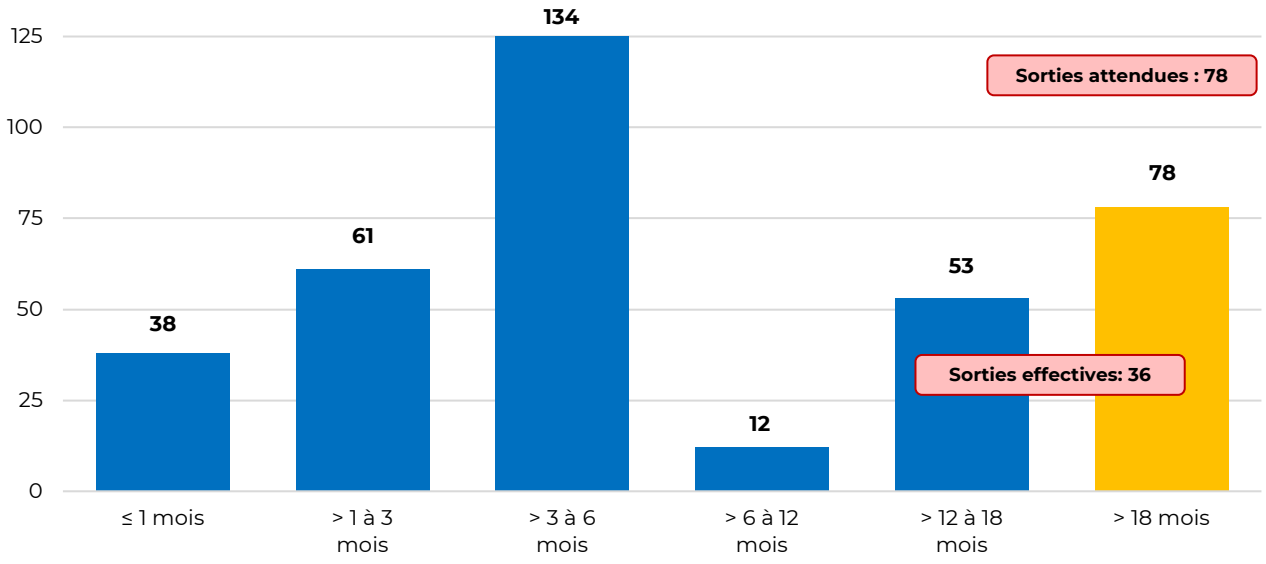

2.2 Lecture du portefeuille par Secteur d'activité

La répartition sectorielle du portefeuille reflète à la fois les priorités d'intervention du PAEB et la structure de l'économie béninoise, largement portée par des activités d'agro-transformation, d'artisanat, de petite production et de services. Cette configuration témoigne d'un alignement satisfaisant entre les orientations stratégiques du programme et les réalités économiques nationales.

L'industrie agroalimentaire (110 PME) et l'agriculture et les services agricoles (86 PME) concentrent à elles seules plus de la moitié du portefeuille. Elles sont suivies par les industries culturelles et créatives (38 PME) ainsi que par le secteur de l'hébergement et de la restauration (31 PME).

Cette structure sectorielle traduit une orientation cohérente vers des activités présentant un fort potentiel de création de valeur, de transformation économique et d'ancrage territorial. Elle confirme également la volonté du programme de soutenir des filières susceptibles de générer des emplois, de renforcer les chaînes de valeur locales et de contribuer à une croissance plus inclusive.

Graphique 2.2.1. Structure sectorielle du portefeuille consolide (376 PME)

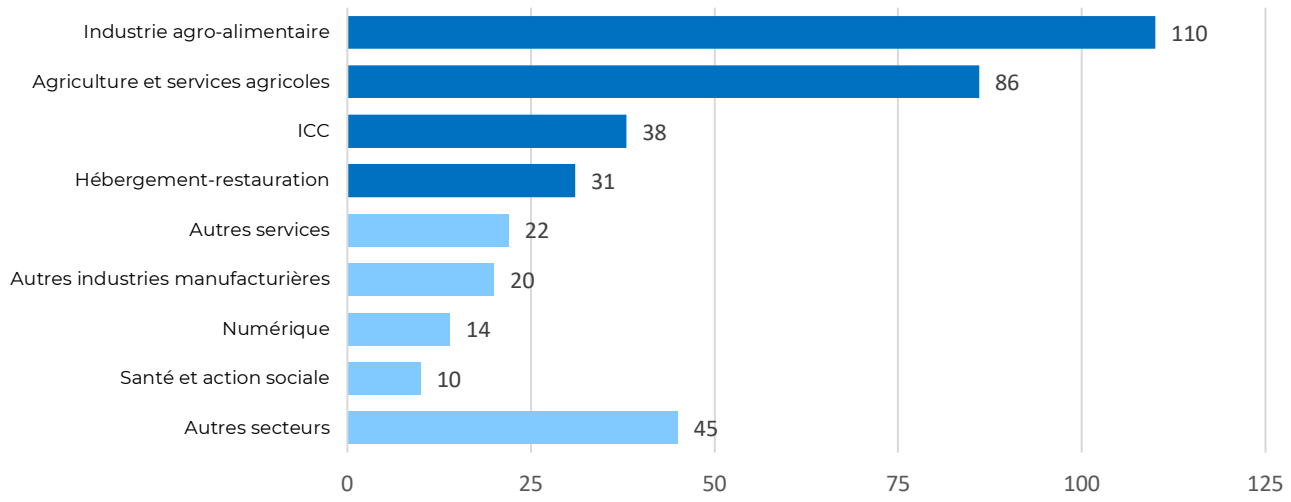

2.3 Composante 2 - Appui aux jeunes entreprises

Graphique 2.3.1 Composante 2 - Évolution du portefeuille, structure par segment et dynamique des appuis financiers

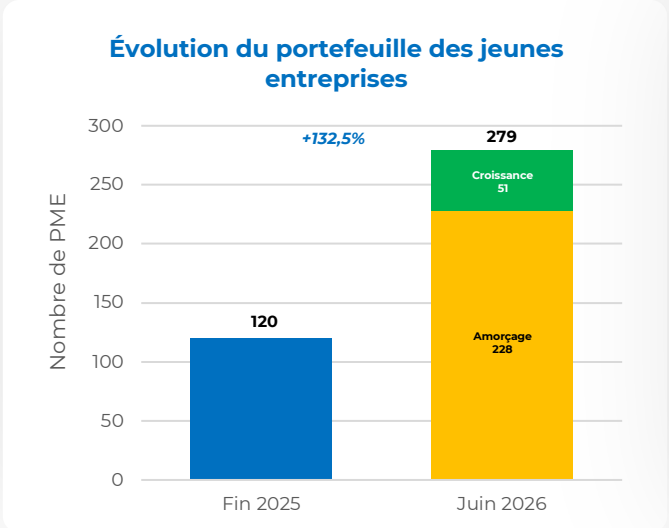

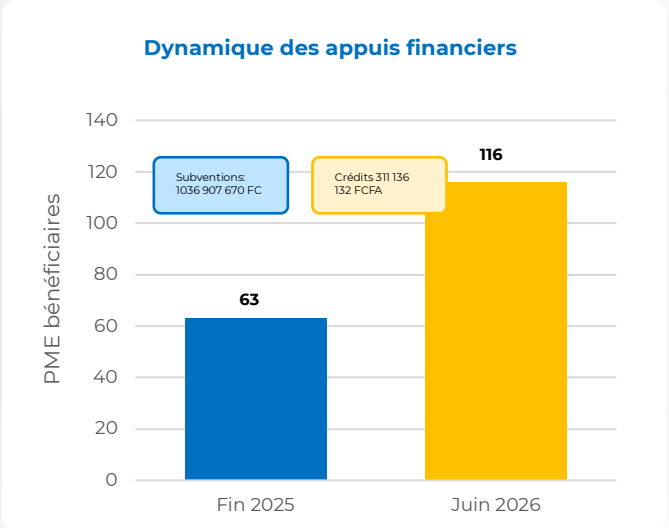

Source: données PAEB au 30/06/2026

La composante 2 est celle qui traduit le plus visiblement la montée en puissance du PAEB sur le segment des jeunes entreprises. **À fin juin 2026, elle totalise 279 PME**, contre 120 au repère 2025, soit une progression de **132,5 %.** Cette évolution illustre un changement d'échelle significatif et témoigne de la capacité du programme à identifier, mobiliser et accompagner un nombre croissant d'entreprises sur les segments de l'amorçage et de la croissance.

La structure du portefeuille confirme la prédominance du segment amorçage, qui concentre 228 PME, tandis que 51 PME relèvent du segment croissance. Cette configuration demeure cohérente avec la vocation du PAEB de soutenir un large vivier d'entreprises en cours de structuration, tout en développant progressivement son intervention auprès de profils plus matures.

L'autre fait marquant du semestre concerne la dynamique des appuis financiers. Le nombre de jeunes entreprises bénéficiaires est passé de **63 à 116 PME**, traduisant un **quasi-doublement** des résultats observés en 2025. Cette progression a été rendue possible par la reprise des décaissements, consécutive à la levée des suspens identifiés par l'AFD en 2025, ainsi que par une plus grande fluidité dans le traitement des dossiers.

Les subventions accordées à 106 PME en phase d'amorçage, pour un montant cumulé de **1,036 milliard FCFA,** témoignent de la capacité du programme à répondre aux besoins les plus structurants des jeunes entreprises. Par ailleurs, **les 10 crédits bonifiés** accordés à des entreprises du segment croissance, à un taux de 3,5 % et pour un montant total de **311,1 millions FCFA**, illustrent la montée en puissance progressive des instruments financiers destinés aux entreprises présentant des besoins plus importants en matière d'investissement et de consolidation.

Au-delà des volumes observés, la composante 2 met en évidence une **meilleure articulation entre accompagnement technique, segmentation des besoins et mobilisation des instruments financiers**. Cette évolution constitue un indicateur tangible de la maturation opérationnelle du programme et confirme la pertinence du modèle d'intervention retenu.

Ce niveau de mise en œuvre traduit une progression réelle, mais appelle encore une accélération au second semestre afin de convertir plus largement la croissance du portefeuille en résultats documentés et en impacts visibles sur les trajectoires des entreprises accompagnées.

Enfin, **le portefeuille de crédits entré en phase active** de remboursement affiche, à date, une performance particulièrement satisfaisante. L'ensemble des échéances exigibles a été honoré par les entreprises bénéficiaires, soit un **taux de remboursement de 100 % sur les échéances échues**. Ce résultat constitue un signal encourageant quant à la qualité du portefeuille et à la capacité des PME accompagnées à respecter leurs engagements financiers sur la durée.

Tableau 2.3.1 Lecture financière synthétique de la composante 2

Rubrique	Niveau à fin juin 2026
Portefeuille jeunes entreprises	279 PME/420 PME
Dont amorçage	228 PME
Dont croissance	51 PME
Bénéficiaires d'appuis financiers	116 PME/255 PME
Subventions	106 PME / 1,036 milliard FCFA
Crédits bonifiés	10 PME / 311,136,132 FCFA
Payement des échéances par les PME	100%

2.4 Composante 3 - Appui aux PME à fort potentiel

Graphique 2.4.1. Composante 3 - Progression du portefeuille à fort potentiel et dynamique de décaissement

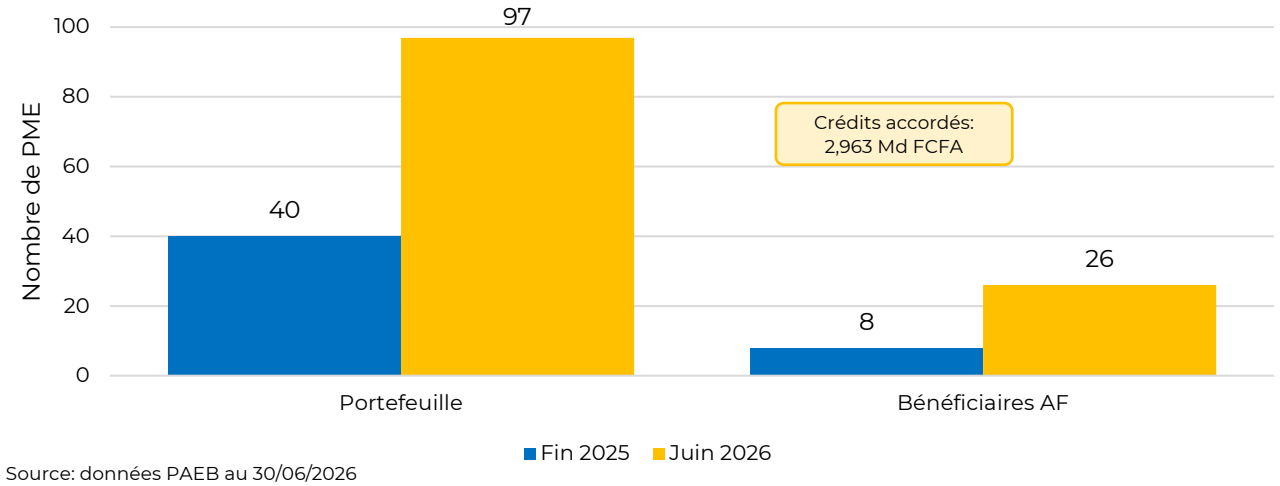

Source: données PAEB au 30/06/2026

La composante 3 confirme, elle aussi, une progression particulièrement soutenue au cours du semestre. À fin juin 2026, le portefeuille des PME à fort potentiel atteint **97 entreprises, contre 40 à fin 2025,** soit une progression de **142,5 %.** Cette évolution traduit le renforcement de la présence du PAEB sur un segment d'entreprises à fort effet de levier économique, pour lesquelles les appuis du programme sont susceptibles de générer des effets plus rapides et plus visibles en matière de structuration, d'investissement, de création d'emplois et de croissance.

La dynamique des appuis financiers sur cette composante est particulièrement remarquable. Le nombre de PME bénéficiaires est passé de **8 à fin 2025 à 26 à fin juin 2026**, pour un montant total de décaissements de **2,964 milliards FCFA.** Cette progression témoigne de la capacité du programme à matérialiser davantage ses interventions auprès des entreprises les plus matures du portefeuille, dans un contexte où la qualité du ciblage et l'adéquation des montants mobilisés aux besoins des bénéficiaires jouent un rôle déterminant.

Au-delà des volumes financés, cette composante occupe **une place stratégique dans l'architecture du PAEB**. Les entreprises accompagnées présentent, en effet, un potentiel plus élevé de transformation économique et constituent des vecteurs privilégiés de démonstration des effets du programme sur l'investissement privé, la montée en gamme des entreprises et leur accès à des financements plus structurants.

Cette performance conforte ainsi la place de la composante 3 dans la dynamique globale du projet et en fait un levier majeur de crédibilité pour l'exécution du programme. Elle constitue également un signal encourageant pour le second semestre, au cours duquel le PAEB devra poursuivre ses efforts afin de consolider les résultats obtenus et d'accompagner la montée en puissance progressive du portefeuille des PME à fort potentiel.

Tableau 2.4.1. Lecture financière synthétique de la composante 3

Rubrique	Niveau à fin juin 2026
Portefeuille PME à fort potentiel	97 PME/120 PME
Bénéficiaires d'appuis financiers	26 PME/40 PME
Crédits bonifiés	2,963,676,326 FCFA
Paiement des échéances échues	100%

2.5 Composante 1 - Renforcement de l'écosystème entrepreneurial et institutionnel

Graphique 2.5.1. Composante 1 - État d'avancement des leviers structurants et taux d'exécution

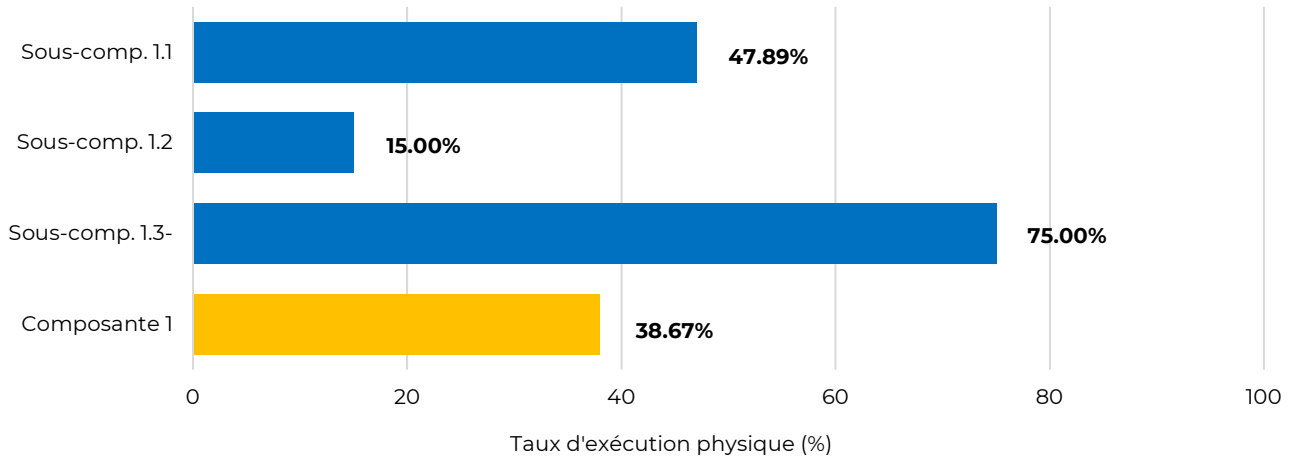

Jalons structurants au 30 juin 2026

Études sectorielles

Processus de passation de marché en cours, avec une finalisation attendue au cours du 2nd semestre 2026.

Déploiement territorial

Dispositif opérationnel validé avec les parties prenantes (CCIB, ADPME et MO) ; phase de diagnostic en cours de lancement.

Renforcement des capacités des SAE, et des banques

Processus contractuel en cours démarrage des activités prévu le 14/09/2026.

Au cours du semestre, **la composante 1** a poursuivi son rôle de **socle stratégique du programme.** Si ses résultats sont moins immédiatement visibles en nombre de PME accompagnées ou financées, elle demeure déterminante pour la qualité, la durabilité et l'efficacité des interventions du PAEB. C'est à ce niveau que se construisent les principaux leviers institutionnels, les outils structurants et les dispositifs de renforcement des acteurs de l'écosystème.

Les études sectorielles relatives aux modèles d'investissement dans la filière avicole et les Industries Culturelles et Créatives (ICC) ont enregistré des avancées significatives. Les procédures de passation de marché ont été engagées. À terme, ces études permettront de renforcer la connaissance des filières concernées et d'affiner le ciblage des interventions sur les secteurs à fort potentiel pour l'entrepreneuriat béninois.

Le déploiement territorial constitue également un chantier majeur de cette composante. Il vise à rapprocher le PAEB des communautés entrepreneuriales et à renforcer son ancrage dans les territoires. À cet égard, la proposition de l'ADPME d'impliquer les ULPE dans l'animation des espaces de la CCIB au niveau régional a reçu un avis favorable, ouvrant la voie à un dispositif de proximité susceptible de renforcer la mobilisation des bénéficiaires et la capitalisation des acquis du programme.

Enfin, le renforcement des capacités des SAE demeure un levier essentiel pour sécuriser la qualité des services rendus aux PME et améliorer la redevabilité du dispositif d'accompagnement. À fin juin 2026, le processus d'enregistrement du contrat du cabinet chargé du diagnostic et du renforcement des SAE était en cours, avec un démarrage des activités attendu au second semestre.

Au total, la composante 1 affiche un taux d'exécution physique de **38,67 %.** Ce niveau doit être apprécié au regard de la nature même des activités concernées, dont une grande partie revêt un caractère institutionnel et préparatoire. Le premier semestre a ainsi principalement permis de consolider les fondations nécessaires à une accélération plus visible des résultats au cours du second semestre.

Aspects transversaux du portefeuille

Crédit photo : PME ESPOIR SOUDURE ET TOURNAGE de la composante 2.1 accompagnée par le PAEB

03 | Aspects transversaux

Le premier semestre 2026 a confirmé la consolidation progressive des fonctions transversales du PAEB. En parallèle de la montée en puissance du portefeuille PME, l'UGP a renforcé ses outils de gestion, amélioré son système de suivi-évaluation, engagé une refonte du dispositif ESG et accru la visibilité institutionnelle du programme. Bien que moins visibles que les résultats directement observables sur le portefeuille, ces évolutions constituent des leviers essentiels pour la qualité de l'exécution, la sécurisation des procédures et la crédibilité du reporting.

Au-delà des résultats opérationnels, le semestre a également été marqué par un renforcement de l'architecture de gestion du programme. Cette dynamique contribue à faire évoluer le PAEB vers un dispositif davantage structuré, mieux instrumenté et plus à même de documenter ses résultats auprès des partenaires techniques et financiers, des bénéficiaires et de l'écosystème entrepreneurial.

Graphique 3.1.1. Tableau de bord des aspects transversaux à fin juin 2026

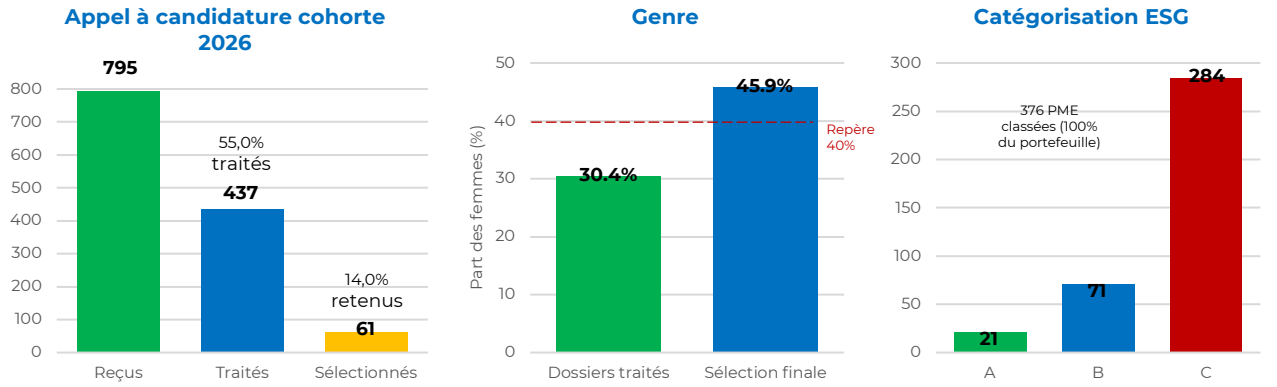

Figure 1.

3.1 Communication, genre et visibilité institutionnelle

Le lancement officiel de la cohorte 2026, organisé en mars 2026 à l'Hôtel Novotel de Cotonou, a constitué le principal temps fort de communication du semestre. Cet événement a permis de **renforcer la visibilité nationale du programme** et de mettre en lumière un processus de sélection à la fois rigoureux, compétitif et inclusif.

À la suite de cet appel à candidatures, le PAEB a enregistré **795 dossiers** sur la plateforme e-PME, dont **437** ont fait l'objet d'une instruction complète. Le processus de sélection a permis de retenir **61 entreprises**, soit un taux de sélection de **14 %**, illustrant le caractère sélectif du dispositif et la volonté du programme de privilégier des entreprises présentant un potentiel avéré de structuration et de croissance.

Sur le plan du genre, les résultats sont particulièrement encourageants. La part des femmes est passée de 30,4 % au stade des dossiers instruits à 45,9 % parmi les entreprises retenues, traduisant une amélioration significative de l'inclusion féminine et confirmant l'efficacité des mécanismes mis en place pour favoriser un accès plus équilibré aux opportunités offertes par le programme.

3.2 Modernisation de l'UGP, suivi-évaluation et gouvernance



L'UGP a engagé au semestre une **modernisation significative de ses outils et de son organisation**. La mise en place d'une application intégrée de gestion, accessible en version web et mobile, permet désormais de centraliser le suivi des PME, des délais d'instruction, des paiements, des livrables de reporting et de la conformité ESG. Cette évolution s'est accompagnée d'une révision de l'organigramme, du renforcement de l'équipe technique, de **l'actualisation du manuel des opérations** avec l'appui de l'assistante technique Expertise France et du relogement de l'unité dans des locaux plus adaptés. Parallèlement, l'opérationnalisation très avancée du système de suivi-évaluation et l'activation de mécanismes de remontée plus réguliers **améliorent la lisibilité des résultats et la capacité de pilotage du projet.**

3.3 ESG et conformité

Le volet ESG a fait l'objet d'une refonte importante destinée à clarifier les exigences applicables aux PME et à améliorer l'efficience du dispositif de conformité. L'activité a été structurée en deux temps : préparation du recrutement d'un prestataire spécialisé, puis mise en œuvre. À fin juin 2026, l'AMI était lancé et les soumissions attendues pour le 3 juillet. Sur le plan opérationnel, **376 PME** étaient déjà catégorisées, dont 21 en catégorie A, 71 en catégorie B et 284 en catégorie C. Cette base permet d'adapter les diligences de suivi, de mieux hiérarchiser les risques et de renforcer la qualité de la documentation du portefeuille.

Exécution physique et financière du programme

Crédit photo : PME NATURE PLUS de la composante 2.1 accompagnée par le PAEB

04 Exécution physique et financière du programme

Graphique 4.1.1. Taux d'exécution physique par composante et taux global consolidé

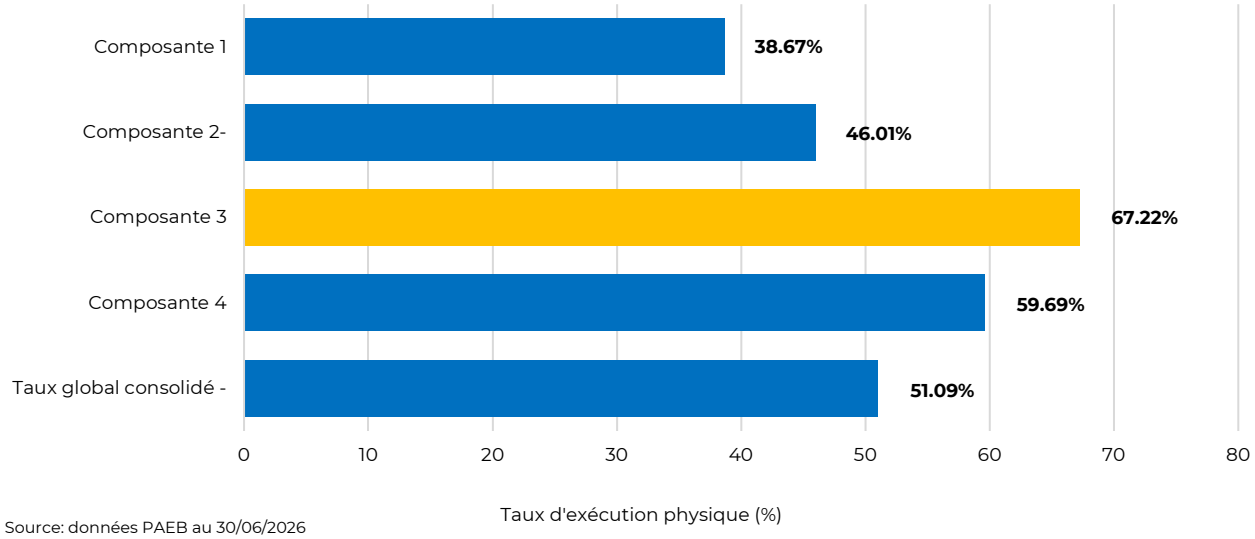

Source: données PAEB au 30/06/2026

La lecture consolidée de l'exécution physique confirme que le premier semestre 2026 a marqué une étape importante dans la trajectoire du PAEB. **À fin juin 2026, le taux global d'exécution physique du programme s'établit à 51,09 %.** Ce niveau traduit une progression satisfaisante, avec des rythmes d'avancement différenciés selon les composantes, en cohérence avec la nature de leurs activités.

La composante 1 affiche un taux d'exécution de **38,67 %**, reflétant le caractère principalement institutionnel et structurant de ses interventions. La composante 2 atteint **46,01 %**, traduisant une montée en puissance progressive des appuis aux jeunes entreprises. La composante 3 enregistre la meilleure performance, avec un taux de 67,22 %, portée par la croissance du portefeuille des PME à fort potentiel et l'accélération des appuis financiers. Enfin, la composante 4 affiche un taux de **59,69 %**, témoignant d'un niveau d'avancement satisfaisant des fonctions de soutien du projet.

Dans son ensemble, cette répartition montre que le premier semestre a été principalement porté par les composantes directement orientées vers les bénéficiaires, tandis que les chantiers institutionnels poursuivaient leur consolidation. Elle confirme également que le PAEB dispose désormais des fondations opérationnelles nécessaires pour produire des résultats plus visibles et accélérer son exécution au cours du second semestre.

Tableau 4.1.1. Taux d'exécution physique à fin juin 2026

Composante	Taux d'exécution physique
Composante 1 - Renforcement de l'écosystème institutionnel	38,67 %
Composante 2 - Appui aux jeunes entreprises	46,01 %
Composante 3 - Appui aux PME à fort potentiel	67,22 %
Composante 4 - Moyens généraux, audit et communication	59,69 %
Taux global du projet	51,09 %

4.2. Bilan d'exécution financière du PTAB 2026 par Composante et Sous-composante

À fin juin 2026, le niveau global d'exécution financière du **PTAB 2026 s'établit à 40,53 %,** correspondant à un montant total de **3,83 milliards** FCFA engagés sur une programmation annuelle de **9,45 milliards FCFA.** Ce niveau d'exécution doit être apprécié à la lumière de la dynamique d'accélération observée au cours du semestre et des spécificités propres à chaque composante.

L'analyse par composante met en évidence une contribution prépondérante de la composante 3, dont le taux d'exécution atteint 49,80 %. Cette performance est principalement portée par les appuis financiers aux PME à fort potentiel, qui concentrent à eux seuls 1,79 milliard FCFA d'engagements. Elle confirme le rôle moteur de cette composante dans la matérialisation des résultats du programme.

Les composantes 1 et 2 affichent des niveaux d'exécution respectifs de 27,48 % et 33,81 %. Ces résultats traduisent des réalités distinctes : d'une part, le caractère institutionnel et préparatoire de plusieurs activités de la composante 1 ; d'autre part, la poursuite de la montée en charge des dispositifs d'accompagnement et de financement des jeunes entreprises au sein de la composante 2.

La composante 4 présente un taux d'exécution de 10,57 %, principalement en raison du calendrier de réalisation des activités d'audit, de suivi-évaluation et de support, dont une part importante est programmée au second semestre.

Enfin, il convient de souligner que le montant total des engagements inclut 741,1 millions FCFA correspondant à des virements ordonnancés avant le 30 juin 2026 et en attente de positionnement bancaire à la date de clôture de la période. La prise en compte de ces opérations permet de refléter plus fidèlement le niveau réel d'avancement financier du programme.

Dans son ensemble, cette situation financière traduit un programme ayant achevé sa phase de consolidation et désormais engagé dans une trajectoire d'accélération, avec une concentration progressive des dépenses sur les activités à plus forte valeur ajoutée et un potentiel important d'exécution au cours du second semestre.

Composante / Sous-composante	Montant prévu 2026	Décaissements réalisés	Virements en attente de positionnement bancaire	Total des engagements de décaissement	Taux d'exécution
Composante 1 : Renforcement des capacités de l'écosystème institutionnel	**863 462 707**	**237 271 569**	**-**	**237 271 569**	**27,48%**
Sous-composante 1.1 : Renforcement des capacités de l'UGP, de la MOA et de la MOD (ADPME)	221 160 782	27 654 005	-	27 654 005	12,50%
Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités et accompagnement des SAE et acteurs financiers	196 787 100	-	-	-	0,00%
Sous-composante 1.3 : Suivi et coordination globale du projet	445 514 826	209 617 564	-	209 617 564	47,05%
Composante 2 : Appui au développement des jeunes entreprises	**3 759 799 299**	**1 271 240 406**	**-**	**1 271 240 406**	**33,81%**

Composante / Sous-composante	Montant prévu 2026	Décaissements réalisés	Virements en attente de positionnement bancaire	Total des engagements de décaissement	Taux d'exécution
Sous-composante 2.1 : Appui non financier aux jeunes entreprises	1 912 450 529	744 836 014	-	744 836 014	38,95%
Sous-composante 2.2 : Appui financier aux jeunes entreprises	1 847 348 770	526 404 392	-	526 404 392	28,50%
Composante 3 : Appui aux PME à fort potentiel	**4 633 671 089**	**1 566 428 870**	**741 066 931**	**2 307 495 801**	**49,80%**
Sous-composante 3.1 : Appui non financier aux PME à fort potentiel	1 474 997 237	518 064 520	-	518 064 520	35,12%
Sous-composante 3.2 : Appui financier aux entreprises à fort potentiel	3 158 673 852	1 048 364 350	741 066 931	1 789 431 281	56,65%
Composante 4 : Moyens Généraux	**128 458 381**	**13 579 000**	**-**	**13 579 000**	**10,57%**
Sous-composante 4.1 : Audit, S&E et support	95 660 531	184 000	-	184 000	0,19%
Sous-composante 4.2 : Communication et visibilité	32 797 850	13 395 000	-	13 395 000	40,84%
Imprévu	65 595 700	990 000	-	990 000	1,51%
BUDGET 2026	**9 450 987 176**	**3 089 509 845**	**741 066 931**	**3 830 576 776**	**40,53%**

4.3. Bilan d'exécution PTAB 2026 par Source de financement

Composante / Sous-composante	Montant prévu 2026	Décaissements réalisés	Virements en attente de positionnement bancaire	Total des engagements de décaissement	Taux d'exécution
Subvention AFD	639 568 907	224 186 564	-	224 186 564	35,05%
Subvention UE	3 805 395 647	1 290 554 539	-	1 290 554 539	33,91%
Crédit AFD	5 006 022 622	1 574 768 742	741 066 931	2 315 835 673	46,26%
BUDGET 2026	**9 450 987 176**	**3 089 509 845**	**741 066 931**	**3 830 576 776**	**40,53%**

4.4. Bilan d'exécution cumulé par Composante et Sous-composante (depuis le démarrage du projet)

La lecture cumulée depuis le démarrage du projet fait apparaître un niveau global d'exécution de **39,71 %, soit 8,39 milliards FCFA engagés sur une enveloppe totale de 21,14 milliards FCFA.** Ce résultat traduit une progression soutenue du programme et confirme son entrée dans une phase d'exécution plus intensive.

Les composantes 1 et 3 affichent les niveaux d'exécution cumulés les plus élevés, avec respectivement **58,88 %** et **52,59 %.** Ces performances s'expliquent par les investissements consentis dans la structuration du dispositif ainsi que par la montée en puissance des appuis destinés aux PME à fort potentiel.

Il convient toutefois de noter que le taux d'exécution élevé observé sur **la sous-composante 1.1 (80,29 %)** doit être apprécié avec prudence. Cette sous-composante intègre les dépenses liées à l'Assistance Technique, dont la mobilisation est intervenue dès les premières phases du programme et représente une part significative des engagements cumulés. Ce niveau d'exécution ne reflète donc pas uniquement les dépenses de fonctionnement de l'UGP, de la MO et de la MOD (ADPME), mais également les investissements consentis pour l'installation, l'opérationnalisation et l'accompagnement du dispositif PAEB et de l'ADPME.

Par ailleurs, la sous-composante 1.2 relative au renforcement des capacités des SAE et des acteurs financiers n'a pas encore enregistré de décaissements. Cette situation s'explique par le calendrier de contractualisation des activités, dont le démarrage effectif est attendu au second semestre 2026.

Dans son ensemble, cette situation confirme que le PAEB dispose encore de marges significatives pour accélérer son exécution tout en maintenant une trajectoire financière cohérente avec ses objectifs et son horizon de mise en œuvre.

Composante / Sous-composante	Montant total projet	Exécution cumulée	Taux d'exécution cumulé
Composante 1 : Renforcement des capacités de l'écosystème institutionnel	**3 685 417 657**	**2 170 094 634**	**58,88%**
Sous-composante 1.1 : Renforcement des capacités de l'UGP, de la MOA et de la MOD (ADPME)	1 803 641 014	1 448 056 055	80,29%
Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités et accompagnement des SAE et acteurs financiers	327 978 500	-	0,00%
Sous-composante 1.3 : Suivi et coordination globale du projet	1 553 798 144	722 038 579	46,47%
Composante 2 : Appui au développement des jeunes entreprises	**9 098 123 590**	**2 017 728 764**	**22,18%**
Sous-composante 2.1 : Appui non financier aux jeunes entreprises	4 611 377 710	935 023 664	20,28%
Sous-composante 2.2 : Appui financier aux jeunes entreprises	4 486 745 880	1 082 705 100	24,13%
Composante 3 : Appui aux PME à fort potentiel	**7 845 245 720**	**4 125 726 476**	**52,59%**
Sous-composante 3.1 : Appui non financier aux PME à fort potentiel	2 492 636 600	730 853 495	29,32%
Sous-composante 3.2 : Appui financier aux entreprises à fort potentiel	5 352 609 120	3 394 872 981	63,42%
Composante 4 : Moyens Généraux	**282 061 510**	**80 029 394**	**28,37%**
Sous-composante 4.1 : Audit, S&E et support	196 787 100	19 444 000	9,88%
Sous-composante 4.2 : Communication et visibilité	85 274 410	60 585 394	71,05%
Imprévu	226 906 022	990 000	0,44%
TOTAL GÉNÉRAL PROJET/BUDGET 2026	**21 137 754 499**	**8 394 569 268**	**39,71%**

4.5. Bilan d'exécution cumulé par Source de financement (depuis le démarrage du projet)

Composante / Sous-composante	Montant total projet	Exécution cumulée	Taux d'exécution cumulé	Écart vs prévu BT (%)
Subvention AFD	6 559 570 000	2 139 491 710	32,62%	67,38%
Subvention UE	4 738 829 499	1 777 499 477	37,51%	62,49%
Crédit AFD	9 839 355 000	4 477 578 081	45,51%	54,49%
TOTAL GÉNÉRAL PROJET/BUDGET 2026	**21 137 754 499**	**8 394 569 268**	**39,71%**	**60,29%**

L'analyse cumulée par source de financement met en évidence une mobilisation progressive et complémentaire des différents instruments financiers du PAEB. À fin juin 2026, le Crédit AFD demeure la source la plus fortement mobilisée, avec un taux d'exécution cumulé de 45,51 %, reflétant notamment la montée en puissance des appuis financiers aux PME.

Les financements sous forme de subventions affichent également une progression satisfaisante, avec des taux d'exécution de 37,51 % pour l'Union européenne et de 32,62 % pour la Subvention AFD. Ces niveaux traduisent l'avancement des activités d'accompagnement, de renforcement des capacités et de structuration du dispositif.

Dans son ensemble, cette répartition confirme le caractère complémentaire des mécanismes de financement mobilisés par le programme et demeure cohérente avec la trajectoire d'exécution attendue à ce stade de sa mise en œuvre.

Crédit photo : PME FAABA SERVICES ET FORMATION de la composante 3 accompagnée par le PAEB

Points d'attention et perspectives du S2

05 Points d'attention et actions de consolidation

Malgré les avancées enregistrées au cours du premier semestre 2026, certains points de vigilance demeurent et feront l'objet d'une attention particulière au cours du second semestre.

Le premier concerne la poursuite de l'accélération des décaissements, afin de maintenir un flux régulier de contractualisation et de paiement au bénéfice des PME. À cet égard, une attention particulière sera portée à la sécurisation des flux de trésorerie du programme et à la finalisation des processus fiduciaires engagés au cours du semestre, notamment ceux liés aux exercices de justification et aux demandes de versement en cours d'instruction auprès de l'AFD.

Le second porte sur la finalisation de plusieurs chantiers structurants, notamment le déploiement territorial, le renforcement des capacités SAE et le lancement des études sectorielles.

Une attention particulière sera également accordée à l'équilibre des niveaux d'exécution entre composantes ainsi qu'à la consolidation des résultats obtenus en matière d'inclusion territoriale et de genre.

Ces éléments ne remettent pas en cause la trajectoire globale du programme. Ils constituent davantage des priorités de gestion destinées à soutenir l'accélération engagée et à renforcer la démonstration des résultats du PAEB au cours du second semestre.

Tableau 5.1.1. Principaux points d'attention et réponses de gestion en cours

Point de vigilance	Enjeu pour le programme	Action prioritaire S2
Accélération des décaissements	Maintenir la dynamique de mise en œuvre et la transformation des dossiers en appuis effectifs	Renforcement du suivi des dossiers, réduction des délais de traitement et accélération des contractualisations
Sécurisation des flux financiers et fiduciaires	Garantir la disponibilité des ressources nécessaires à l'accélération du programme	Finalisation des exercices de justification, obtention des attestations de dépenses et suivi des demandes de versement en cours d'instruction
Chantiers structurants	Assurer la mise en œuvre effective des activités préparatoires engagées au S1	Finalisation des validations et lancement opérationnel du déploiement territorial, du programme de renforcement des capacités des SAE et des études sectorielles
Équilibre de l'exécution entre composantes	Maintenir une progression harmonieuse du programme	Pilotage renforcé des composantes 1 et 2 et suivi rapproché des indicateurs d'exécution
Inclusion territoriale et genre	Consolider les acquis en matière d'équité et de couverture territoriale	Poursuite du ciblage des femmes entrepreneures et des entreprises situées hors des principaux pôles économiques

06 Perspectives et plan d'accélération S2

Le second semestre 2026 devra constituer une période d'accélération maîtrisée pour le PAEB. Les bases opérationnelles et institutionnelles du programme ayant été largement consolidées au cours du premier semestre, l'enjeu est désormais de transformer cette dynamique en résultats plus visibles, tant en termes d'exécution que d'impact sur les entreprises accompagnées.

Les priorités du semestre porteront sur l'accélération des appuis aux PME, la mise en œuvre effective des chantiers structurants de la composante 1, la consolidation des résultats en matière d'inclusion territoriale et de genre, ainsi que le renforcement des fonctions de suivi-évaluation et de capitalisation.

Une attention particulière sera également accordée à la sécurisation des flux financiers, à la poursuite du dialogue avec les partenaires techniques et financiers et à la fluidification des processus de validation nécessaires au maintien d'un rythme soutenu de mise en œuvre.

À ce stade, le programme dispose d'un portefeuille significativement renforcé, de mécanismes d'intervention désormais éprouvés et d'une dynamique de financement relancée. Le second semestre devra ainsi être celui de la transformation des acquis en résultats démontrables et durablement inscrits dans la trajectoire du PAEB.

Tableau 6.1.1. Priorités opérationnelles du second semestre 2026

Priorité	Finalité attendue
Accélérer les décaissements et le traitement des dossiers matures	Transformer plus rapidement la préparation en appuis effectifs (portage transitoire)
Lancer effectivement les chantiers structurants de la composante 1	Donner un contenu opérationnel au renforcement institutionnel (déploiement territorial)
Consolider le portefeuille des composantes 2 et 3	Accroître la qualité du ciblage et la performance des appuis
Renforcer le suivi-évaluation et la capitalisation	Rendre les résultats plus visibles et mieux documentés
Poursuivre le rééquilibrage territorial et l'inclusion genre	Améliorer la portée inclusive et l'ancrage du programme
Sécuriser le dialogue avec les partenaires	Fluidifier les validations et soutenir l'accélération du projet

En définitive, le PAEB dispose désormais d'un portefeuille renforcé, d'outils de gestion opérationnels et d'un **dispositif d'intervention pleinement fonctionnel**. Le principal enjeu du second semestre sera de maintenir cette dynamique afin d'accélérer l'exécution du programme et d'en renforcer les effets sur les entreprises accompagnées.

07 | Annexes

Annexe 1

Tableau détaillé de l'exécution financière au 30.06.2026.

Annexe 2

Tableau détaillé des indicateurs du cadre logique

Annexe 3

Analyse du portefeuille Appui Financier (AF)
